

ความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2565

ผลการดำเนินงาน

เริ่มต้นสัญญา

: 6 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา

: 19 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาตามสัญญา

: 1,170 วัน


ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว

: **848** วัน (ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะ Ramp 3
- งานก่อสร้างฐานราก Main Line & Ramp
- งานก่อสร้างเสา Main Line & Ramp
- งานติดตั้งคานขวาง (Cross Beam, Portal Beam)
- งานติดตั้ง Precast Segmental Box Girder
- งานติดตั้ง Precast I-Girder
- งานหล่อ Precast Segmental Box Girder
- งานหล่อ Precast I-Girder
- งานหล่อ Precast Portal Beam
- งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดินในพื้นที่โครงการฯ

สรุปความก้าวหน้างานที่ดำเนินการในโครงการฯ

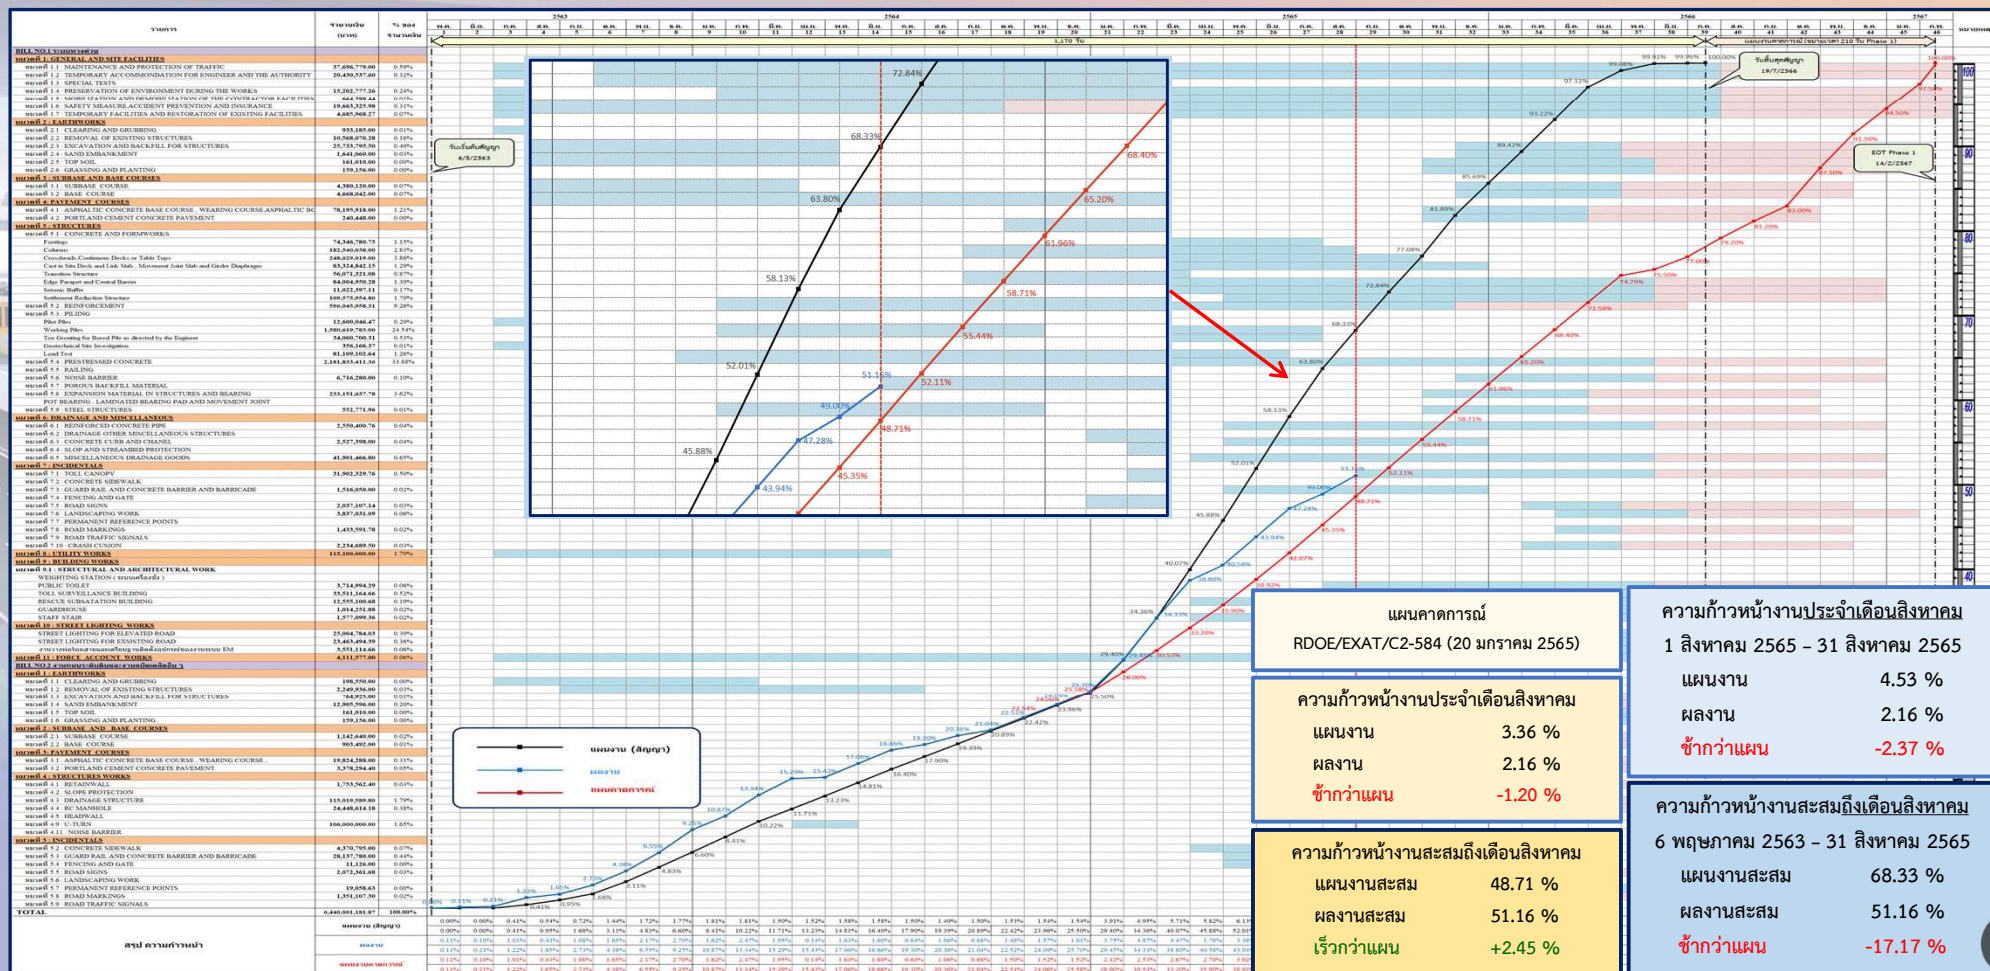

ความก้าวหน้างานสะสมถึงเดือนสิงหาคม 2565


ตามแผนคาดการณ์ขยายเวลา

แผนงานสะสม	48.71 %
ผลงานสะสม	51.16 %
เร็วกว่าแผน	+2.45 %


ตามแผนการก่อสร้าง

แผนงานสะสม	68.33 %
ผลงานสะสม	51.16 %
ช้ากว่าแผน	-17.17 %

แผนผังแสดงพื้นที่ก่อสร้าง : Main Line


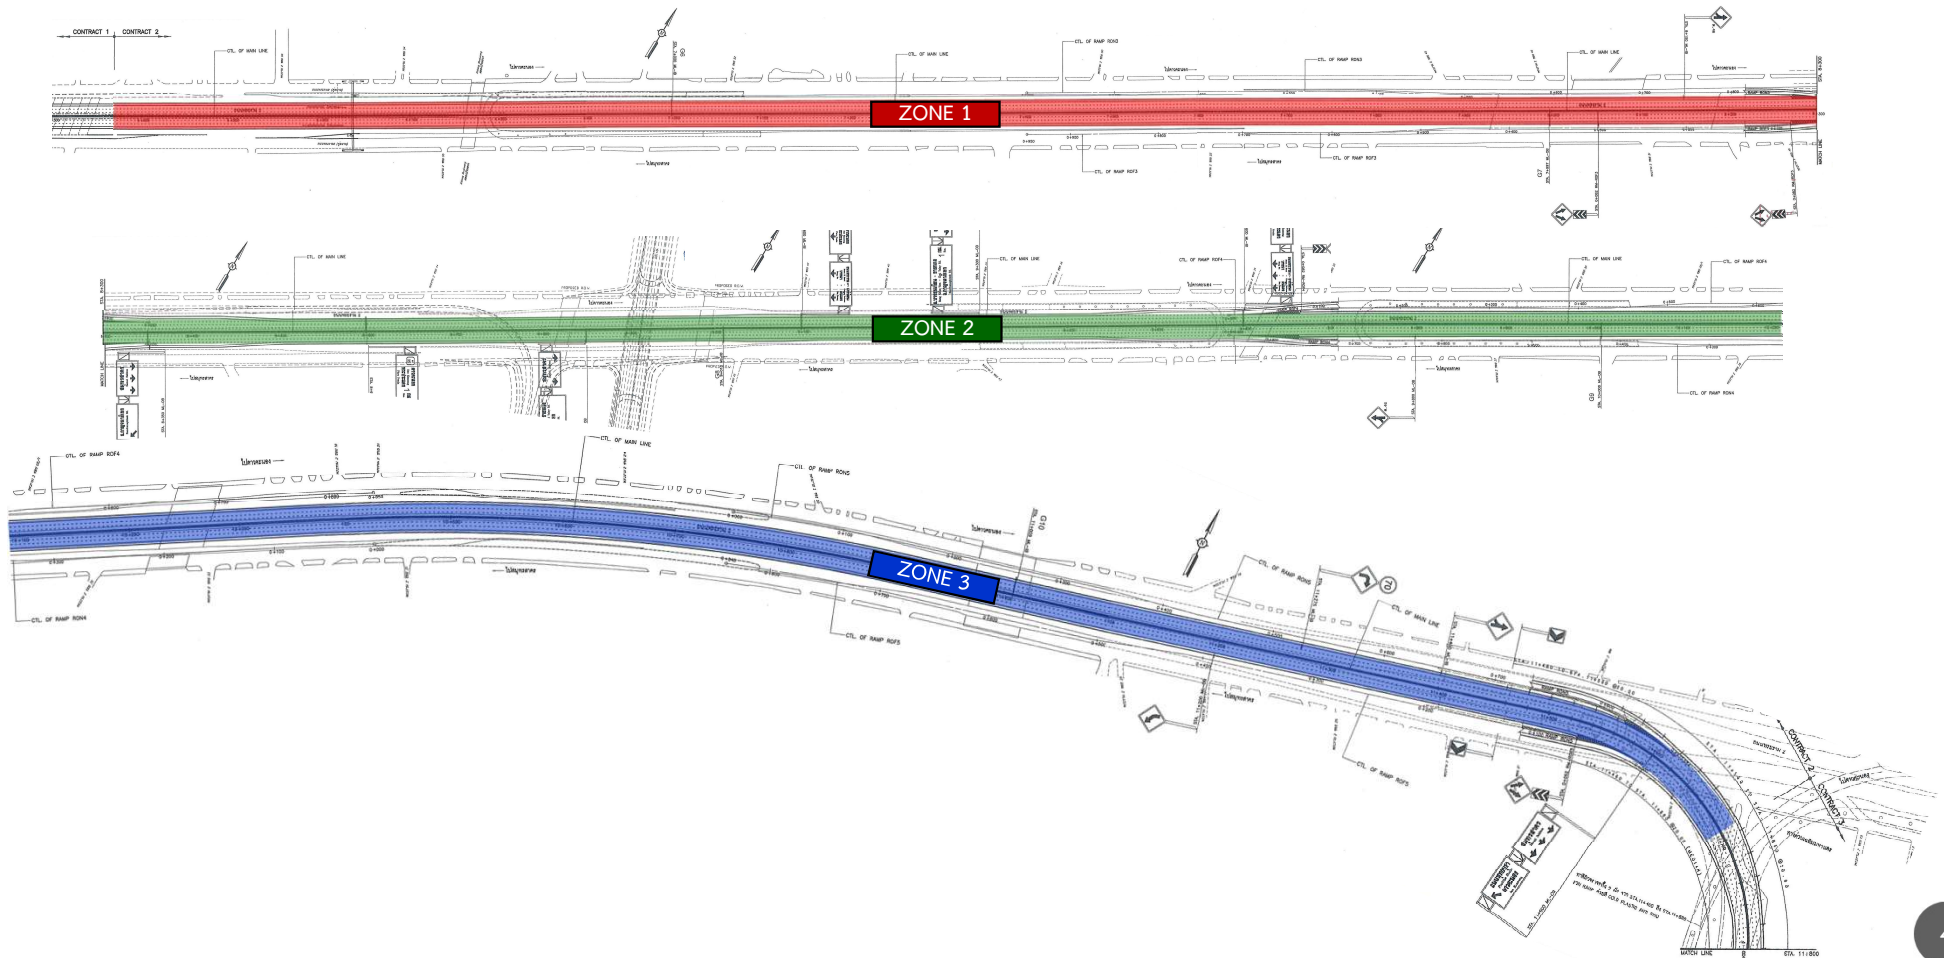


ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line

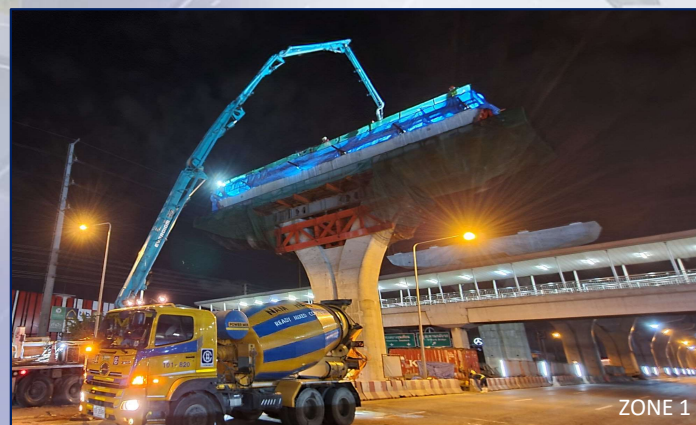

งานฐานราก (Footing), เสาตอม่อ (Column), คานขวาง (Cross beam)

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line

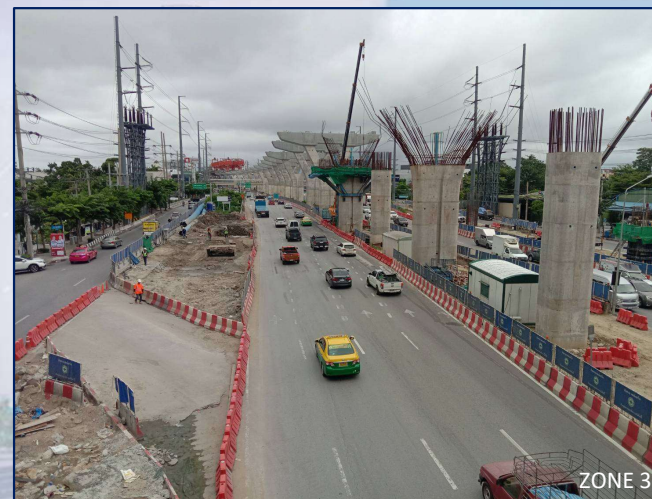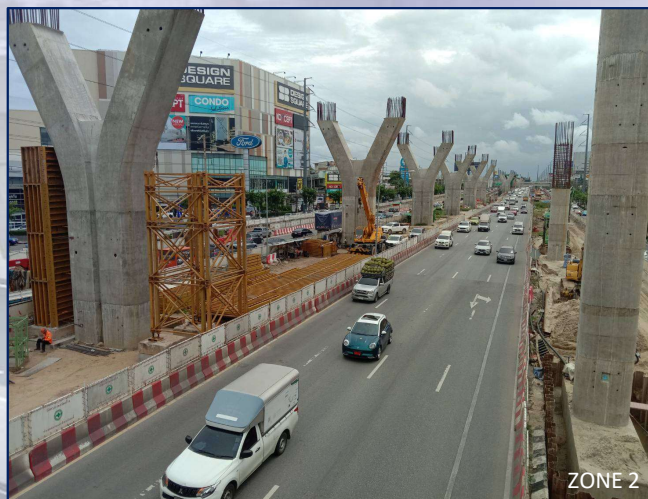

ภาพรวมความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line




งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Segmental Box Girder Erection)

Zone 1 ติดตั้งได้ 9 Span

Zone 2 ติดตั้งได้ 10 Span


Zone 3 ติดตั้งได้ 11 Span

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp

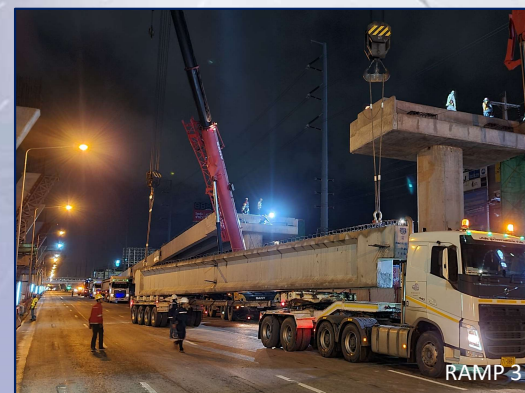

งานเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile), งานฐานราก (Footing), เสาตอม่อ (Column), คานคอนกรีตอัดแรง (I-Girder & C-Girder)

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp

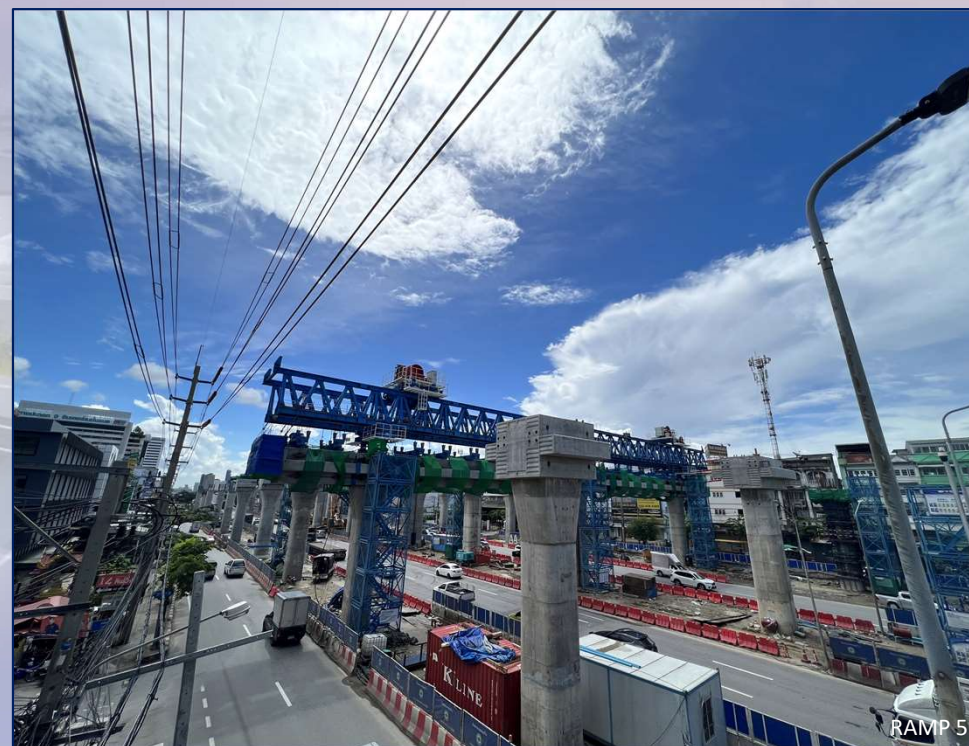

งานคานขวาง (Portal Beam)

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้าง : งานผลิตชิ้นงาน



งานคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Box Segment), คานคอนกรีตอัดแรง (I-Girder & C-Girder)

สรุปกำลังคน (Manpower) เดือนสิงหาคม 2565

พื้นที่ก่อสร้าง	On Site Workers
Zone 1	220
Zone 2	225
Zone 3	183
รวมทั้งหมด	628

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

งานควบคุมคุณภาพและงานทดสอบในโครงการฯ

การทดสอบ Sand Density Test : Lab CTB JV



งานทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ 28 วัน : Lab CTB JV



การทดสอบคุณสมบัติหิน ทราายผสมคอนกรีตที่ใช้ในโครงการ : Lab CTB JV



สถิติความปลอดภัยในการทำงาน (พื้นที่โครงการฯ)

สถิติความปลอดภัยข้อมูลวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

เริ่มปฏิบัติงาน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

- ทำงานมาแล้ว 848 / 1,170 วัน (คิดเป็น 72.47 / 100 %)
- คิดเป็นชั่วโมงการทำงาน 3,746,948 ชั่วโมงแรงงาน (ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น)

$$3,615,828 + 131,120 = 3,746,948$$

- อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากบุคคล 0 ราย
- อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 0 ราย
- เป้าหมายความปลอดภัย (ช่วงที่ 2: 6/5/63 - 31/12/64) = 3,000,000 ชั่วโมงแรงงาน

ปัจจุบันยอดกำลังพลสัญญา 2 = 596 คน

(ZONE 1 = 188 , ZONE 2 = 225 , ZONE 3 = 183)
