

ความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินงาน


ระยะเวลาตามสัญญา : 1,170 วัน

ระยะเวลาดำเนินการแล้ว : 574 วัน (ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะ (Working Pile)
- งานก่อสร้างฐานราก (Footing)
- งานก่อสร้างเสา (Column)
- งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ (Pre-cast Crosshead Installation)
- งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปกล่อง (End Segment & Pier Segment Installation)
- งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ (Pre-cast Crosshead Production)
- งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปกล่อง (Pre-cast Segment Production)
- งานติดตั้ง Launching Gantry สำหรับงานประกอบติดตั้ง Pre-cast Segment
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2

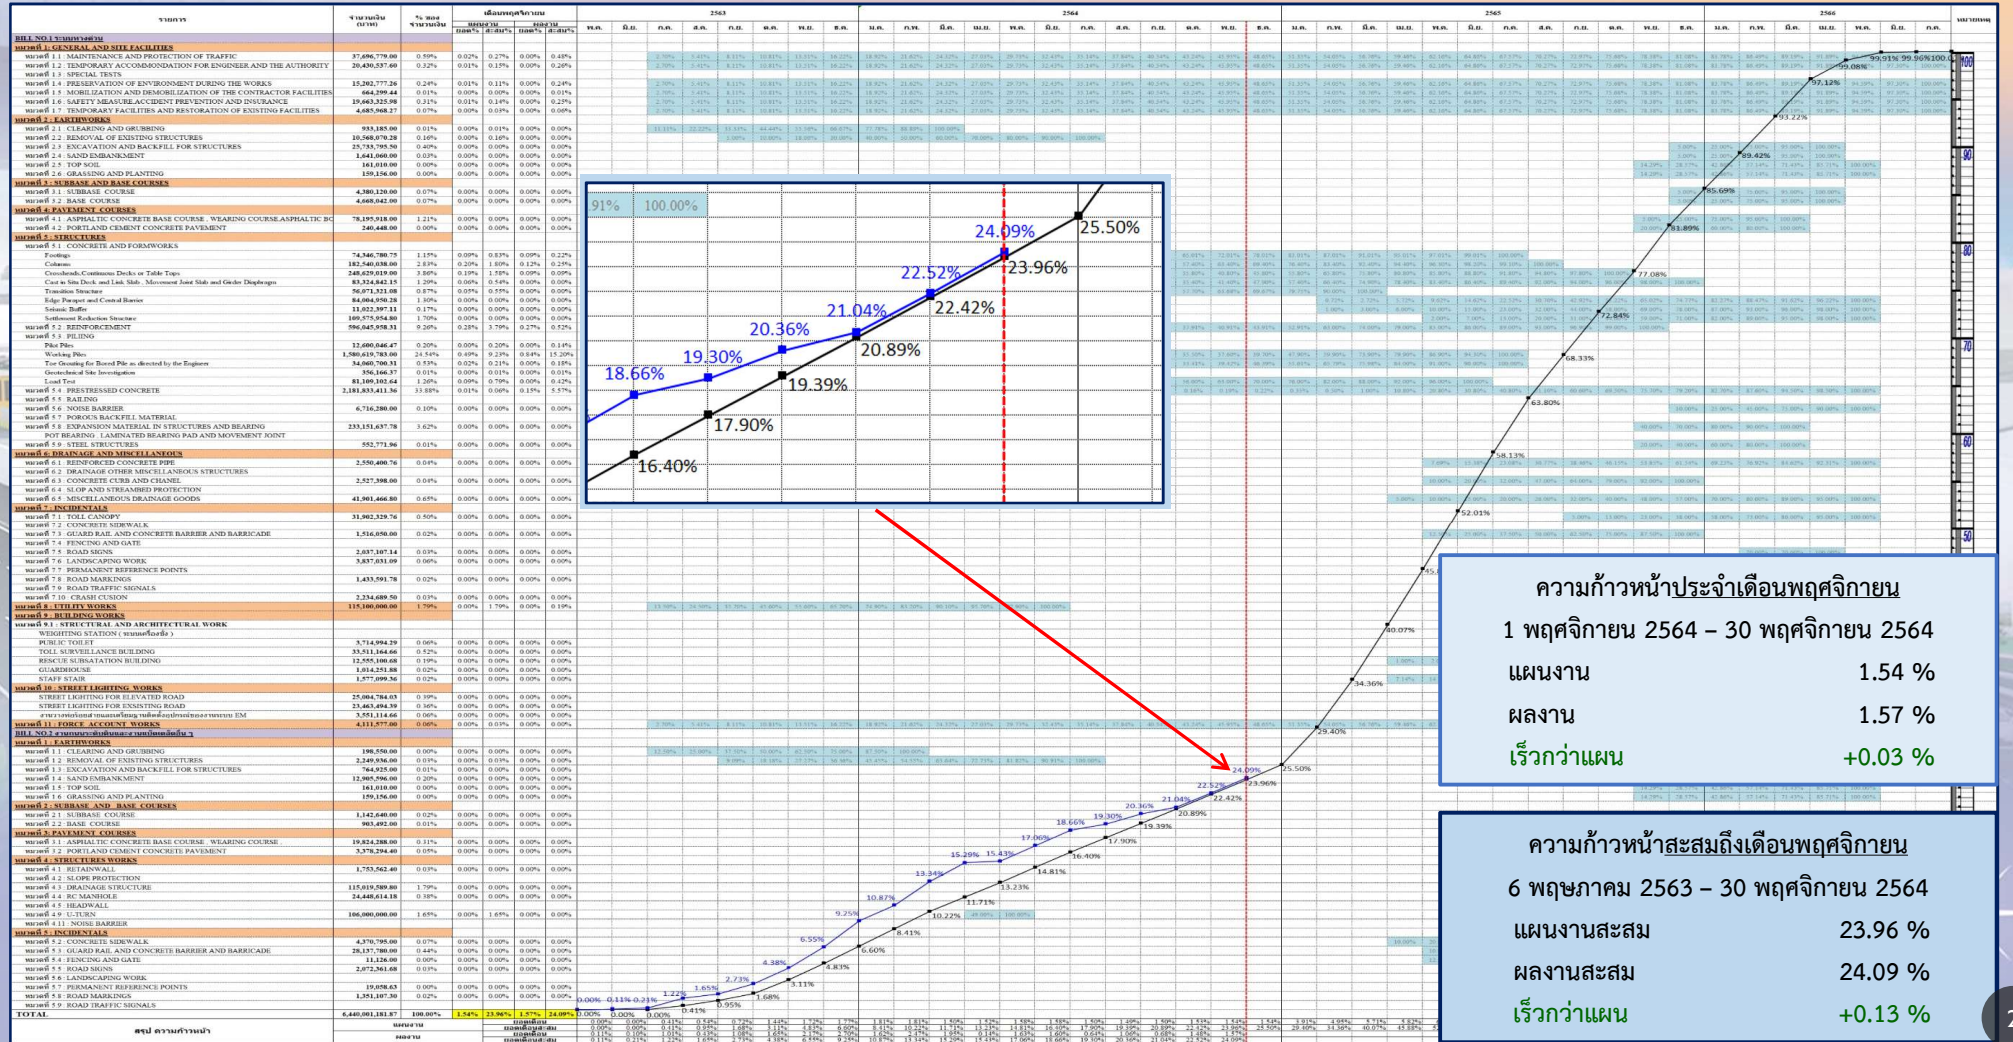


งานเสาเข็มเจาะ (Working Pile) : Main Line


ZONE 1



ZONE 2

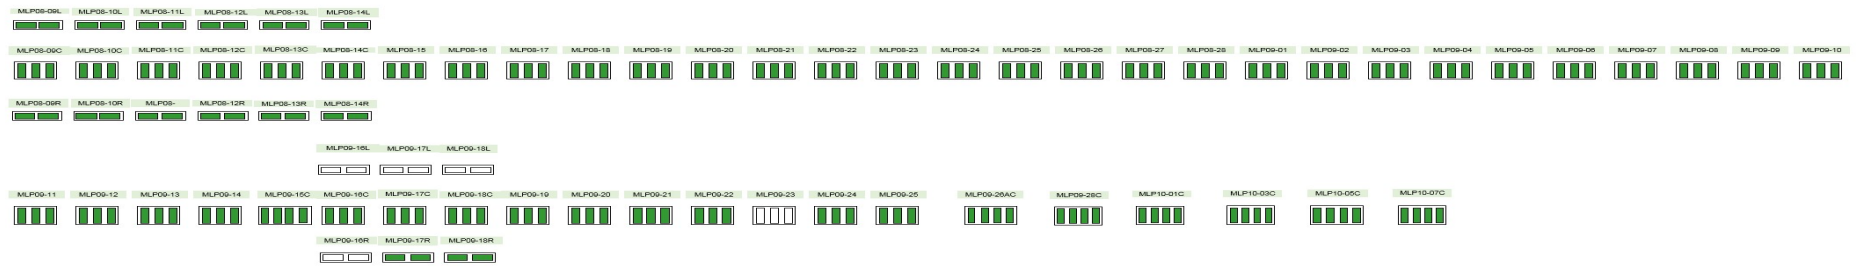

ZONE 3




Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64


รายการ	ปริมาณตามแบบ			หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
	3.80x1.00	3.00x1.00	Total		เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
ZONE 1	161	0	161	ต้น	8	140	86.96 %	0	161	100.00 %	Finish
ZONE 2	162	40	202	ต้น	0	202	100.00 %	0	185	91.58 %	-8.42 %
ZONE 3	153	8	161	ต้น	6	153	95.03 %	5	134	83.23 %	-11.80 %
รวม	476	48	524	ต้น	14	495	94.47 %	5	480	91.60 %	-2.86 %

งานเสาเข็มเจาะ (Working Pile) : On-Off Ramp


ZONE 1



ZONE 2



ZONE 3



Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64

รายการ	ปริมาณตามแบบ					หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
	3.80x1.00	3.00x1.00	2.00x0.80	Ø1.00	Total		เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
RAMP 3 – ด้านท่าข้าม	-	110	-	30	140	ต้น	4	140	100.00 %	4	109	77.86 %	-22.14 %
RAMP 4 – ด้านบางมด	-	108	-	28	136	ต้น	14	122	89.71 %	4	40	29.41 %	-60.29 %
RAMP 5 – ด้านพุทธบูชา	4	103	4	28	139	ต้น	0	139	100.00 %	4	46	33.09 %	-66.91 %
รวม	4	321	4	86	415	ต้น	18	401	96.63 %	12	195	46.99 %	-49.64 %

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (Working Pile)




ติดตั้งผนังนำร่องเสาเข็ม MLP11-22L



เจาะเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.00 ม. MLP07-24L No.1




ลงเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.00 ม. MLP07-24L No.1

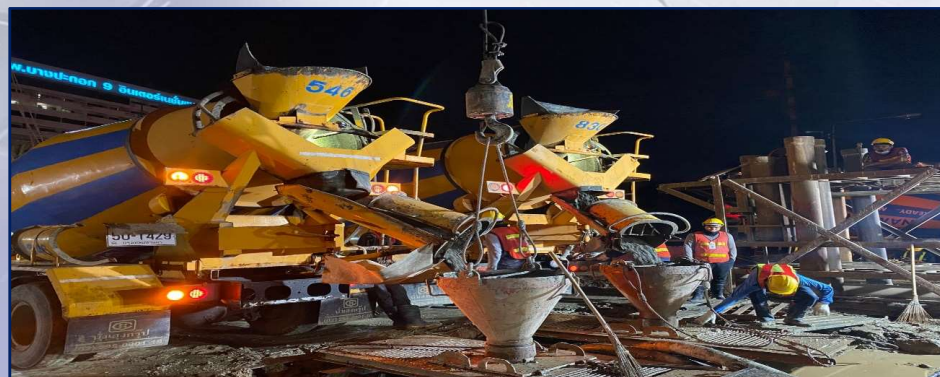

เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.00 ม. MLP11-22L No.2

งานฐานราก (Footing) : Main Line

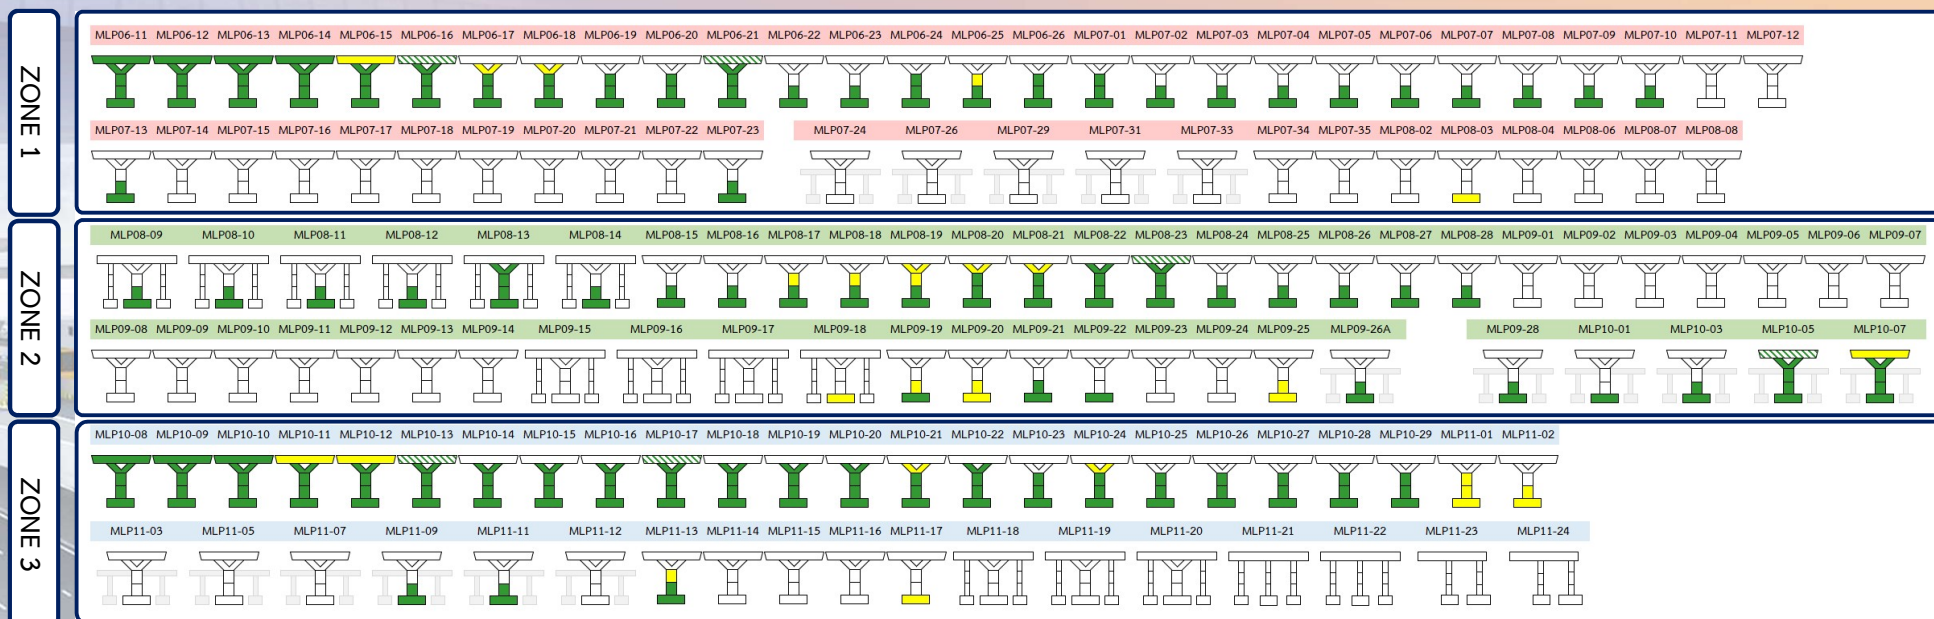


Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64


รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
ZONE 1	52	ฐาน	2	39	75.00 %	1	29	55.77 %	-19.23 %
ZONE 2	72	ฐาน	4	64	88.89 %	3	32	44.44 %	-44.49 %
ZONE 3	54	ฐาน	8	42	77.78 %	3	28	51.85 %	-25.93 %
รวม	178	ฐาน	14	145	81.46 %	7	89	50.00 %	-31.46 %

งานฐานราก (Footing) : On-Off Ramp


ZONE 1



ZONE 2



ZONE 3




Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
RAMP 3 – ด้านท่าข้าม	55	ฐาน	7	27	49.09 %	1	4	7.27 %	-41.82 %
RAMP 4 – ด้านบางมด	54	ฐาน	4	26	48.15 %	1	2	3.70 %	-44.45 %
RAMP 5 – ด้านพุทธบูชา	54	ฐาน	4	54	100.00 %	2	6	11.11 %	-88.89 %
รวม	163	ฐาน	15	107	65.64 %	4	12	7.36 %	-58.28 %

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้างฐานราก (Footing)

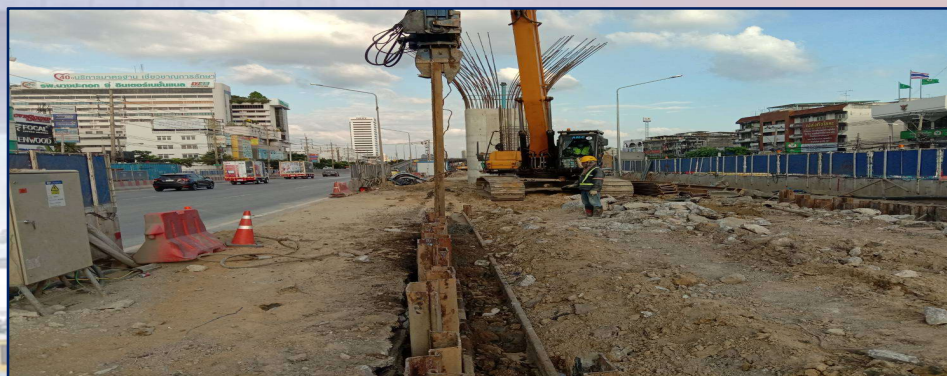

ติดตั้ง Sheet pile MLP11-12



สกัดคอนกรีตหัวเสาเข็ม ROF4-13




ติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก MLP06-15



เทคอนกรีตฐานราก MLP11-02

งานเสา (Column) : Main Line

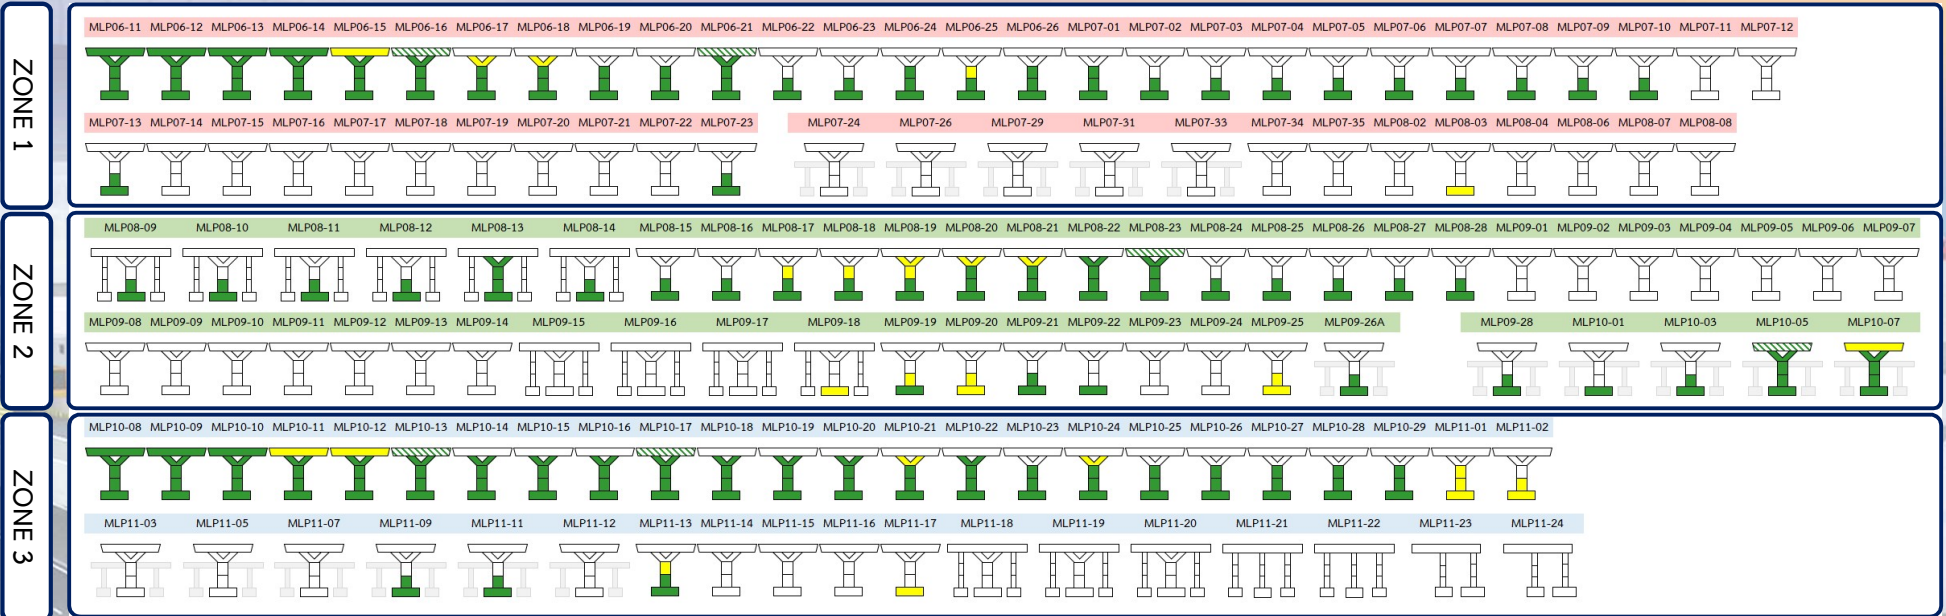


Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64


รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน							+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้			สะสม			คิดเป็น	
						Step 1	Step 2	Step 3	Step 1	Step 2	Step 3		
ZONE 1	52	ต้น	3	37	71.15 %	0	1	2	28	15	9	31.73 %	-39.42 %
ZONE 2	72	ต้น	4	60	83.33 %	3	3	3	29	10	8	20.69 %	-62.64 %
ZONE 3	54	ต้น	6	35	64.81 %	2	2	2	27	24	16	40.19 %	-24.63 %
รวม	178	ต้น	13	132	74.16 %	5	6	7	84	49	33	29.83 %	-44.33 %

งานเสา (Column) : On-Off Ramp


ZONE 1



ZONE 2



ZONE 3



Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)


ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน					+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้		สะสม		คิดเป็น	
						Step 1	Step 2	Step 1	Step 2		
RAMP 3 – ด้านท่าข้าม	55	ต้น	4	20	36.36 %	0	0	2	1	2.73 %	-33.64 %
RAMP 4 – ด้านบางมด	54	ต้น	2	22	40.74 %	0	0	0	0	0.00 %	-40.74 %
RAMP 5 – ด้านพุทธบูชา	54	ต้น	7	50	92.59 %	4	1	6	1	6.48 %	-86.11 %
รวม	163	ต้น	13	92	56.44 %	4	1	8	2	3.07 %	-53.37 %

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้างเสา (Column)



ติดตั้งเหล็กเสริมเสาตอม่อ MLP11-11 Step-1

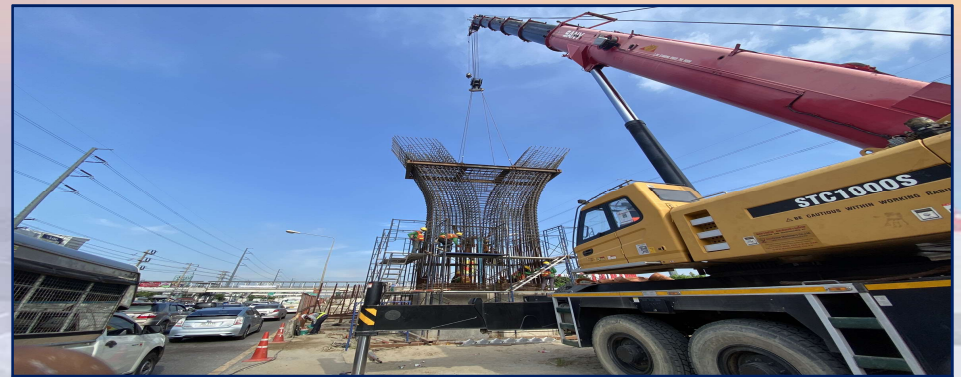

ติดตั้งเหล็กเสริมเสาตอม่อ MLP08-22 Step-2




เทคอนกรีตเสาตอม่อ MLP08-19 Step-2



เทคอนกรีตเสาตอม่อ MLP06-18 Step-3

งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง (Pre-cast Crosshead Installation) : Main Line

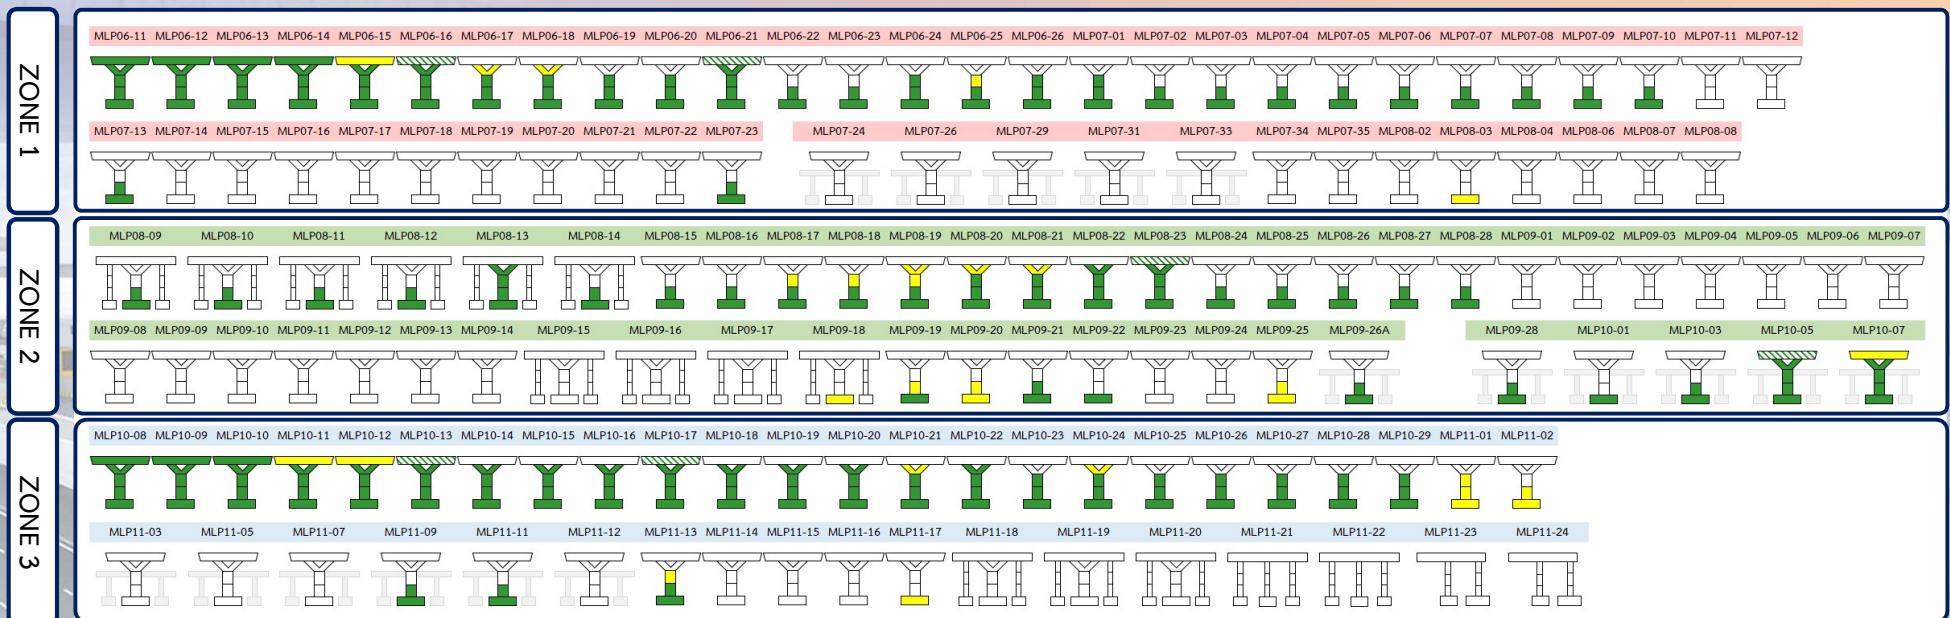

Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)


ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
ZONE 1	52	ชุด	3	32	61.54 %	1	5	9.62 %	-51.92 %
ZONE 2	42	ชุด	2	32	76.19 %	1	1	2.38 %	-73.81 %
ZONE 3	35	ชุด	4	27	77.14 %	2	5	14.29 %	-62.86 %
รวม	129	ชุด	9	91	70.54 %	4	11	8.53 %	-62.02 %

ภาพถ่ายงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง (Pre-cast Crosshead Installation)



ติดตั้ง Support คานคอนกรีตอัดแรง MLP06-21

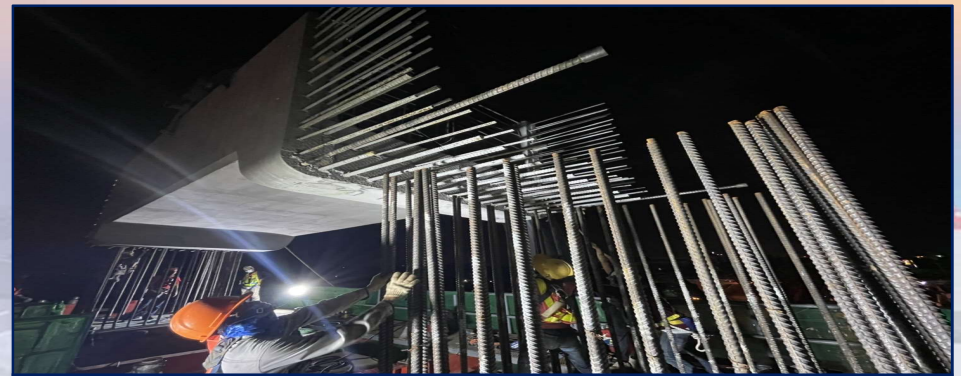

ติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง MLP06-21 (Pre-cast Crosshead)




เทคอนกรีตคานคอนกรีตอัดแรง MLP06-15



ติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง MLP06-14

งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Pre-cast Segment Erection) : Main Line

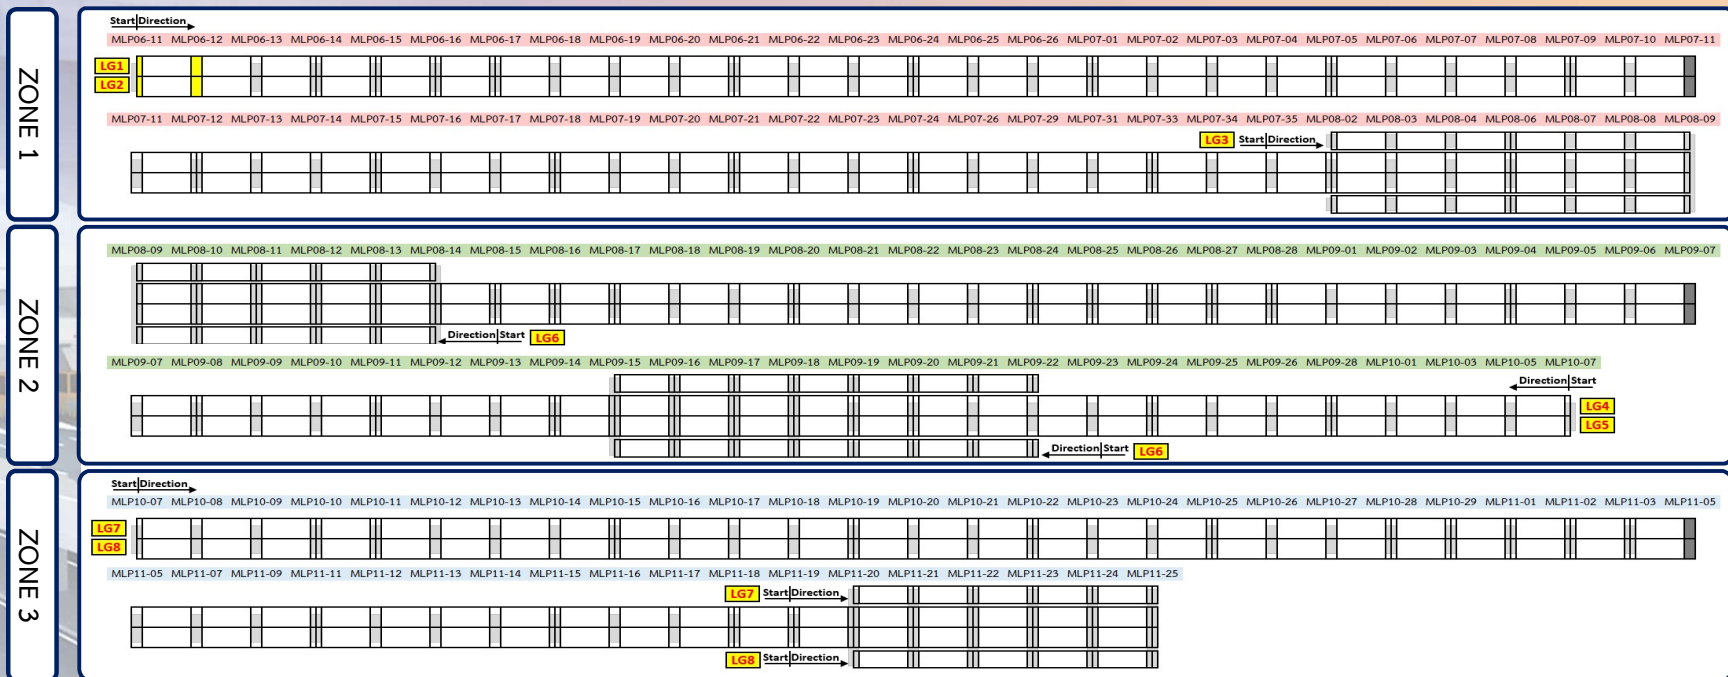

Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
ZONE 1	104	Span	6	42	40.38 %	0	0	0.00 %	-40.38 %
ZONE 2	100	Span	6	36	36.00 %	0	0	0.00 %	-36.00 %
ZONE 3	86	Span	6	34	39.53 %	0	0	0.00 %	-39.53 %
รวม	290	Span	18	112	38.62 %	0	0	0.00 %	-38.62 %


ภาพถ่ายงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Pre-cast Segment Erection)



ติดตั้ง Pot Bearing ที่ MLP06-12



Grout Bottom Plate of Pot Bearing ที่ MLP06-13

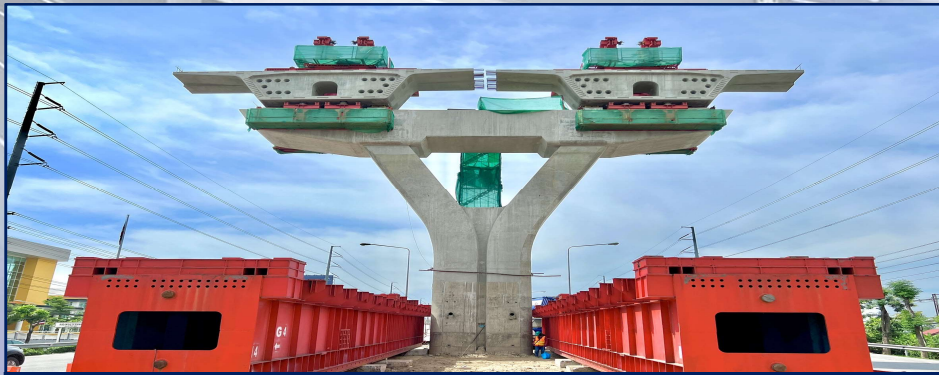


ติดตั้ง End Segment ที่ MLP06-11



ติดตั้ง Launching Gantry LG1 & LG2 ที่ MLP06-11 to MLP06-12

งานหล่อชิ้นส่วนคานคอนกรีตอัดแรง (Pre-cast Crosshead Production) : Main Line

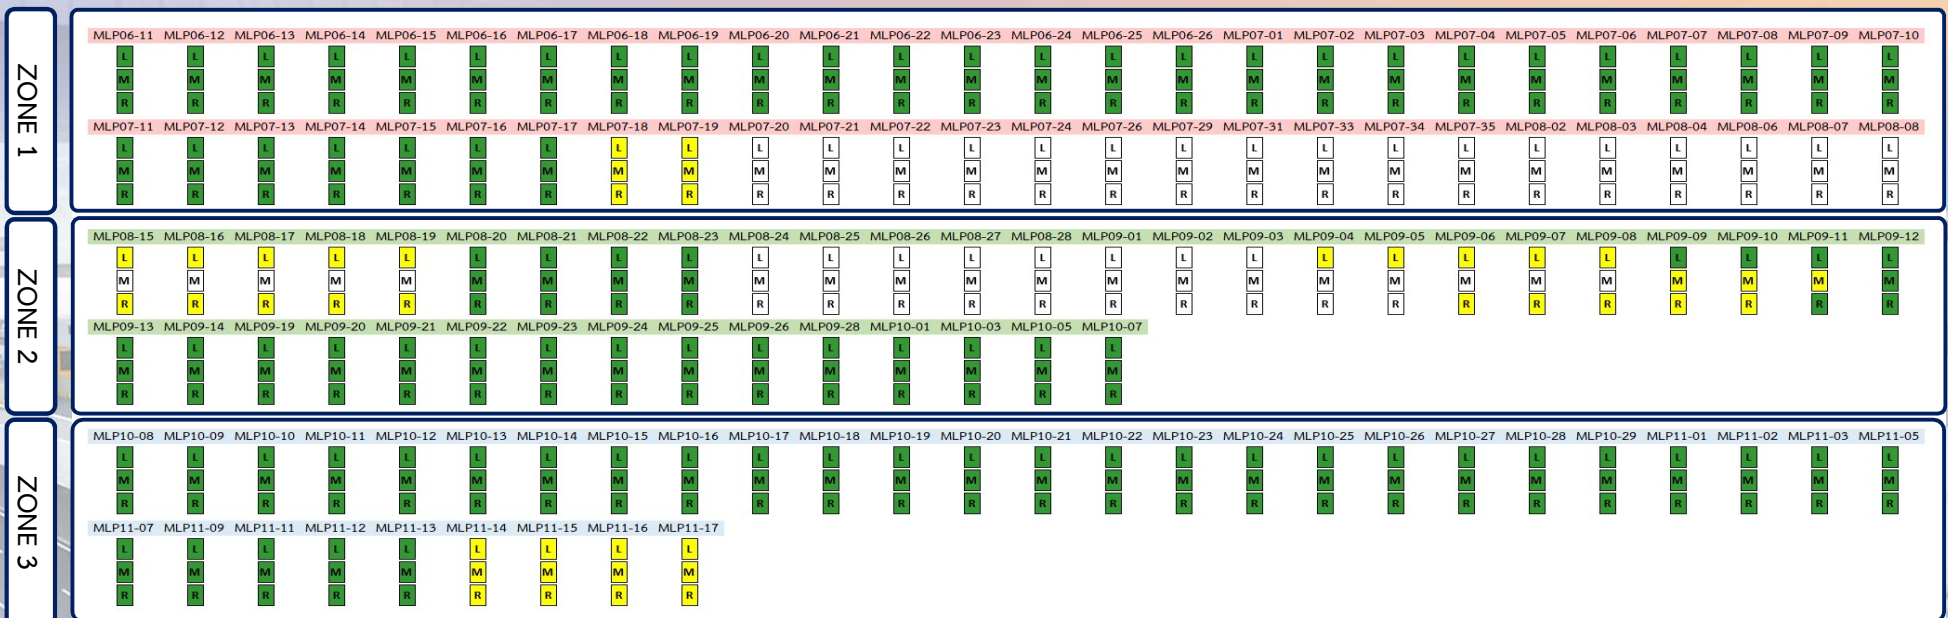

Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64


รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
ZONE 1	52	ชุด	2	34	65.38 %	2	35	67.31 %	1.92 %
ZONE 2	42	ชุด	2	34	80.95 %	7	29	69.05 %	-11.90 %
ZONE 3	35	ชุด	3	30	85.71 %	4	35	100.00 %	Finish
รวม	129	ชุด	7	98	75.97 %	13	99	76.74 %	-0.78 %

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานหล่อชิ้นส่วนคานคอนกรีตอัดแรง (Pre-cast Crosshead Production)

TP YARD, HICRETE YARD, APC YARD



งานหล่อชิ้นส่วนคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Pre-cast Segment Production)

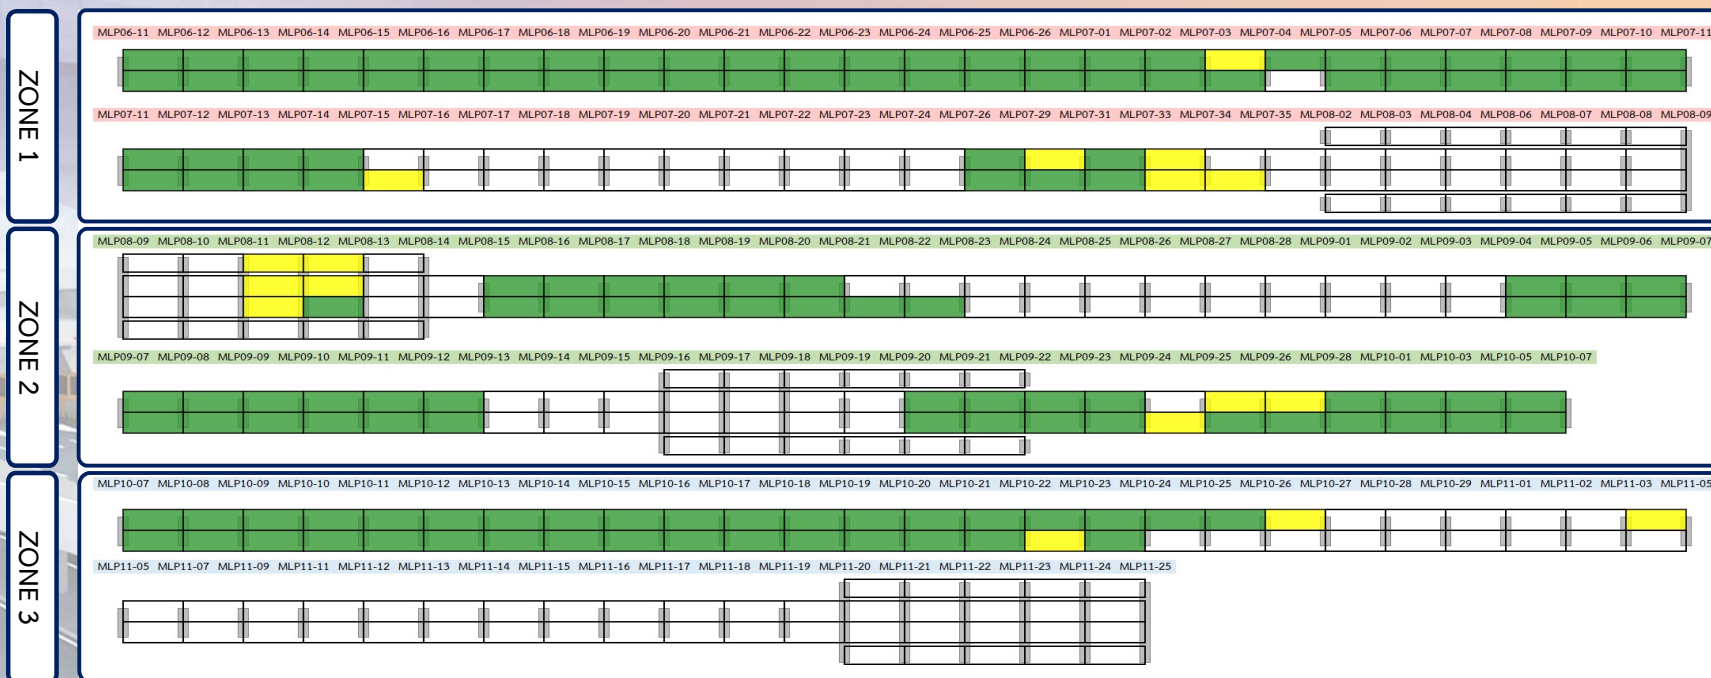


Ref. Master Schedule Rev.02 (CTB-MAA-C2-L-0010-2563)

ข้อมูลวันที่ 30 พ.ย. 64

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
ZONE 1	1,546	ชิ้น	90	1,164	75.29 %	66	839	54.27 %	-21.02 %
ZONE 2	1,720	ชิ้น	102	853	49.59 %	64	730	42.44 %	-7.15 %
ZONE 3	1,396	ชิ้น	84	924	66.19 %	43	498	35.67 %	-30.52 %
รวม	4,662	ชิ้น	276	2,941	63.08 %	173	2,067	44.34 %	-18.75 %

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานหล่อชิ้นส่วนคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Pre-cast Segment Production)

ITD YARD, TBTC YARD, HICRETE YARD, GEL YARD

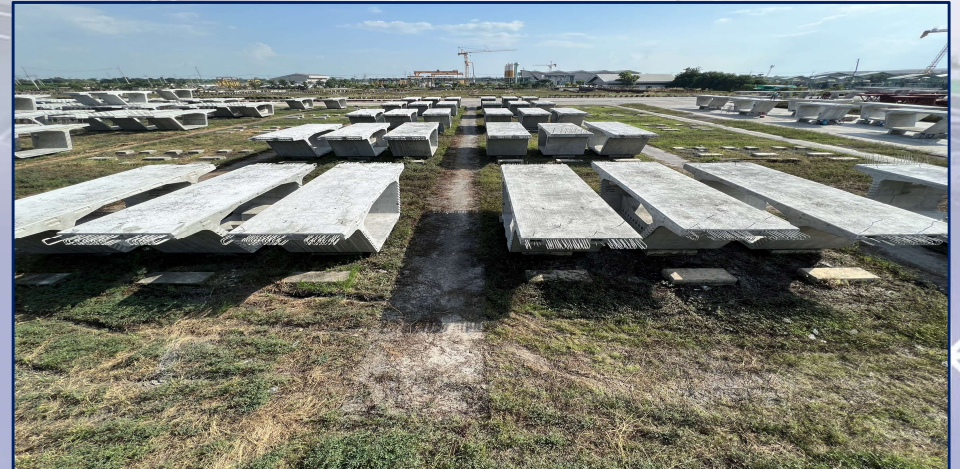

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

วาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

สรุปกำลังคน (Manpower) เดือนพฤศจิกายน 2564

พื้นที่ก่อสร้าง	วิศวกร	คนงาน	รวม
Zone 1	5	206	211
Zone 2	12	223	235
Zone 3	5	193	198
รวมทั้งหมด	22	622	644
