

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

วิดีโอความก้าวหน้างานก่อสร้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

PROGRESS RECORD VDO NO.19
AS DECEMBER 2021



TIPAKORN
CTB Joint Venture
กิจการร่วมค้า ซีทีบี

CONTRACT 2 : CIVIL WORKS

ความก้าวหน้าประจำเดือน ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงาน


ระยะเวลาตามสัญญา : 1,170 วัน

ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว : 605 วัน (ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะ (Working Pile)
- งานก่อสร้างฐานราก (Footing)
- งานก่อสร้างเสา (Column)
- งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ (Pre-cast Crosshead Installation)
- งานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปกล่อง (End Segment & Pier Segment Installation)
- งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จ (Pre-cast Crosshead Production)
- งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูปกล่อง (Pre-cast Segment Production)
- งานติดตั้ง Launching Gantry สำหรับงานประกอบติดตั้ง Pre-cast Segment
- งานสำรวจและรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

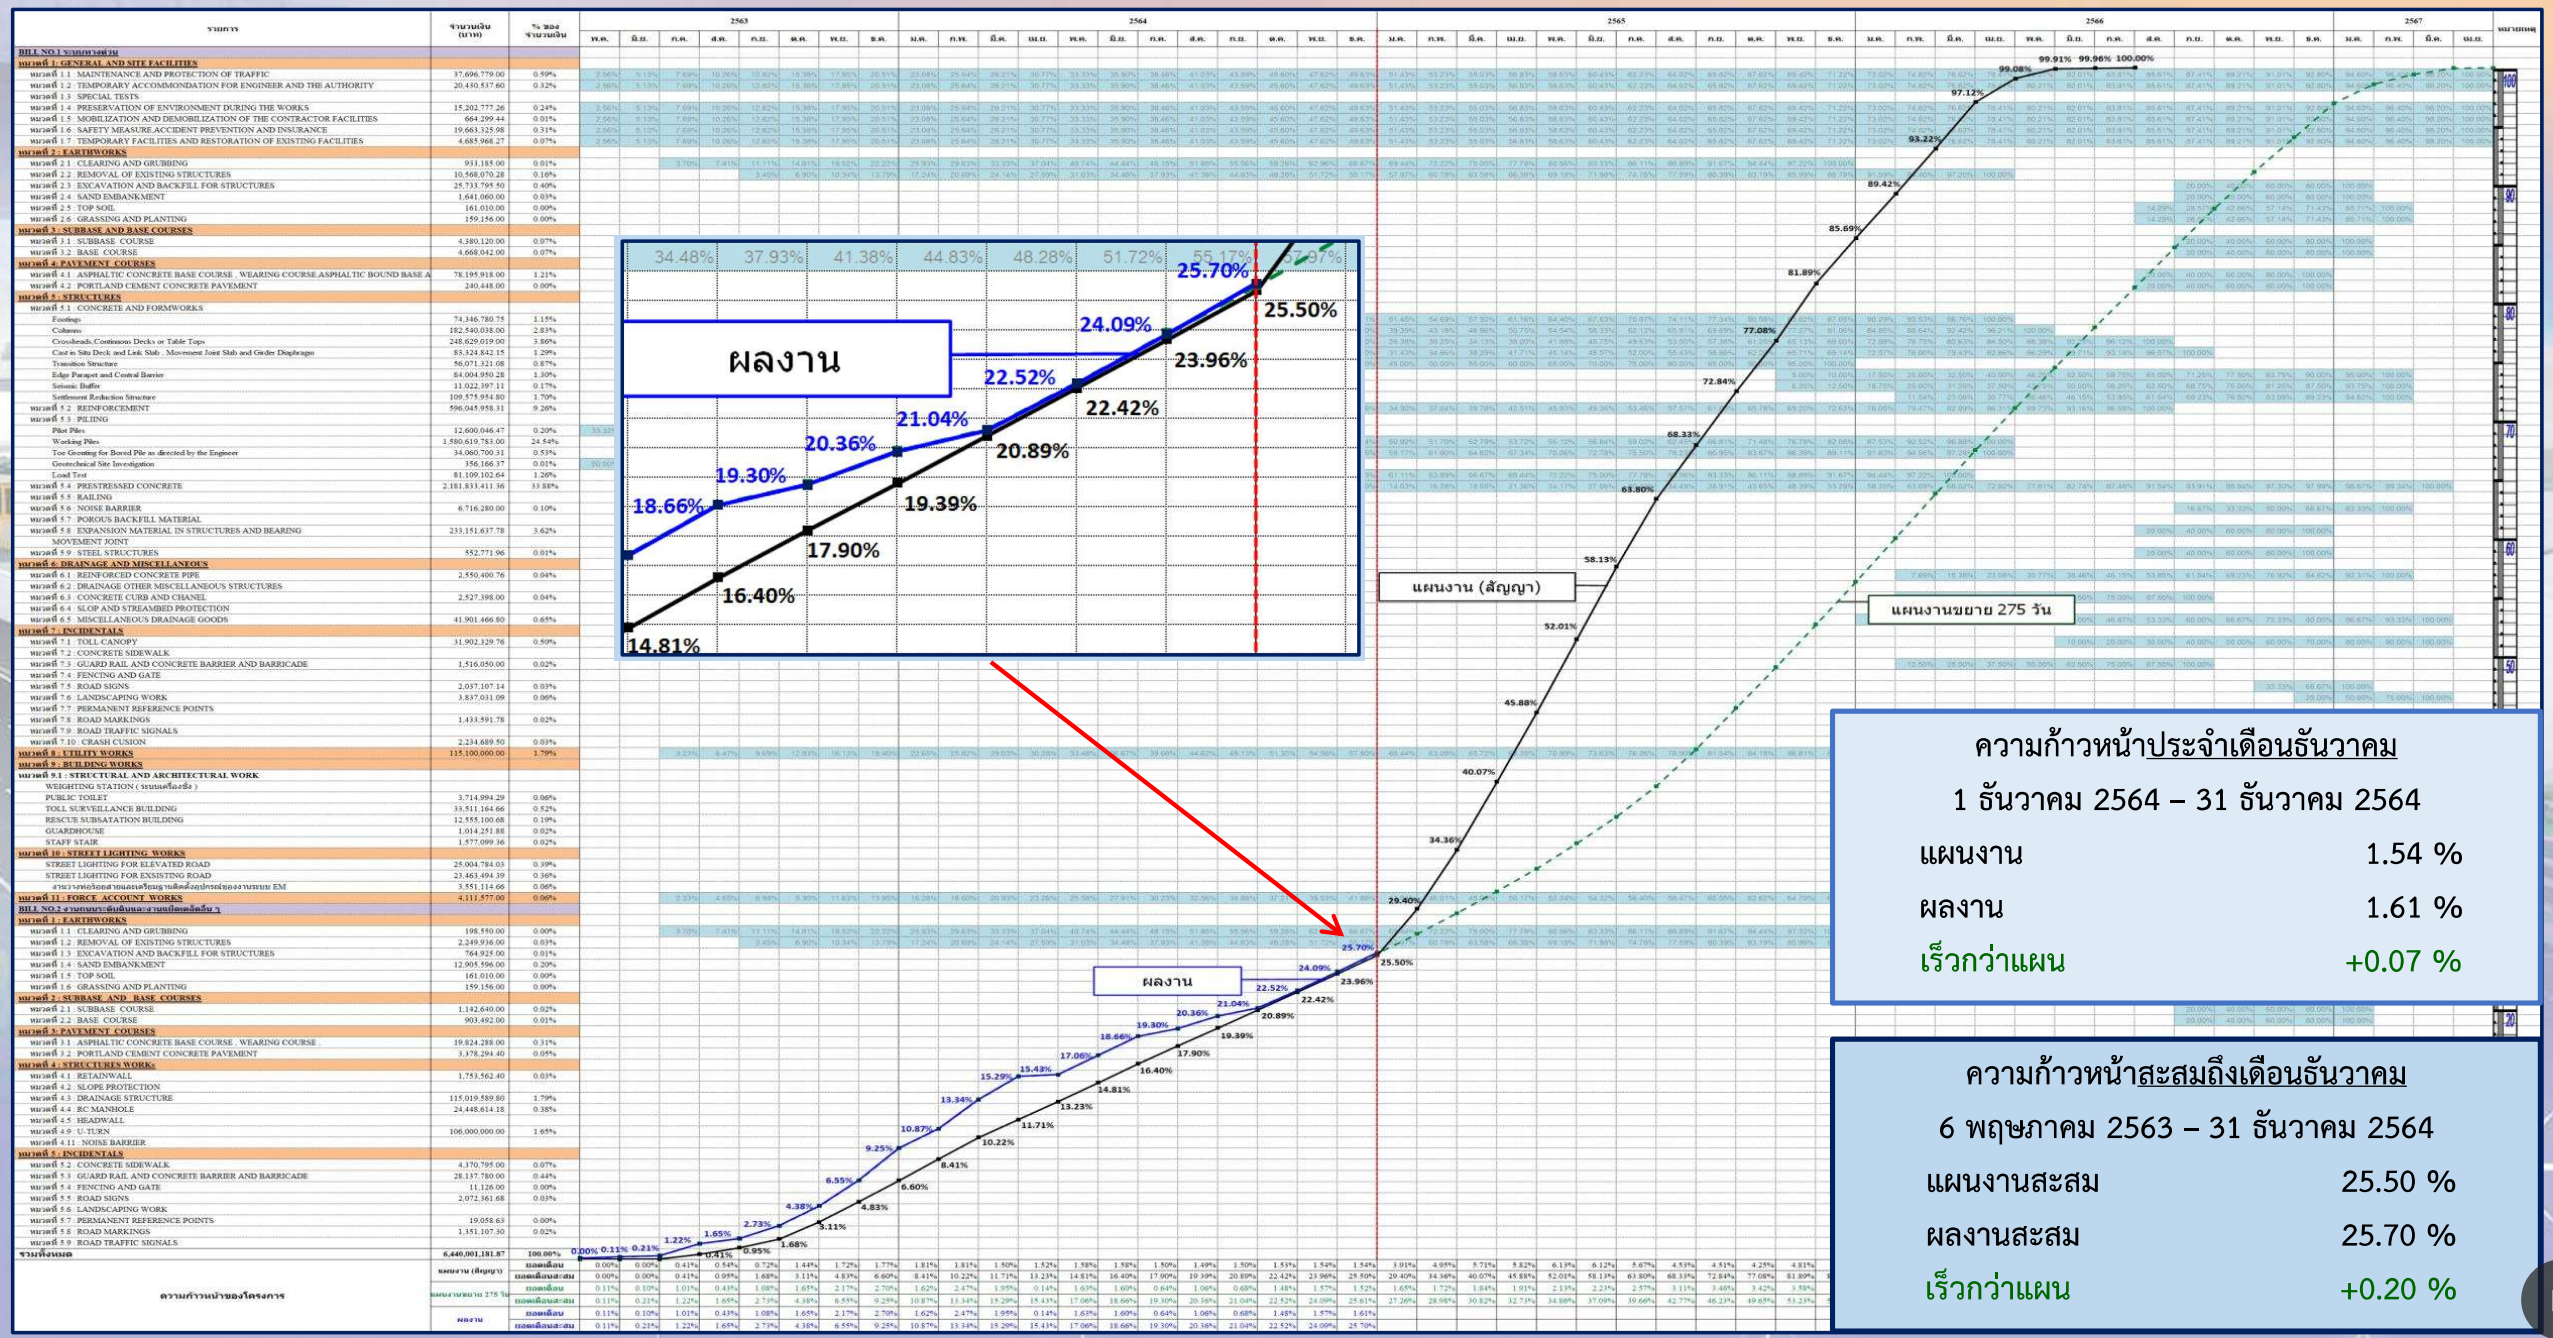

ความก้าวหน้าประจำเดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
แผนงาน 1.54 %
ผลงาน 1.61 %
เร็วกว่าแผน +0.07 %

ความก้าวหน้าสะสมถึงเดือนธันวาคม
6 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564
แผนงานสะสม 25.50 %
ผลงานสะสม 25.70 %
เร็วกว่าแผน +0.20 %

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ (Working Pile)



เจาะเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.00 ม. RON4-02 No.2



เจาะเสาเข็มรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.80 ม. MLP11-19L No.1



ลงเหล็กเสริมเสาเข็มเจาะรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.00 ม. MLP11-11R No.1



เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะรูปสี่เหลี่ยม 1.00x3.00 ม. MLP11-11R No.1

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้างฐานราก (Footing)




ติดตั้ง Sheet Pile MLP07-14



สกัดคอนกรีตหัวเสาเข็ม MLP09-11



ติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก MLP11-07

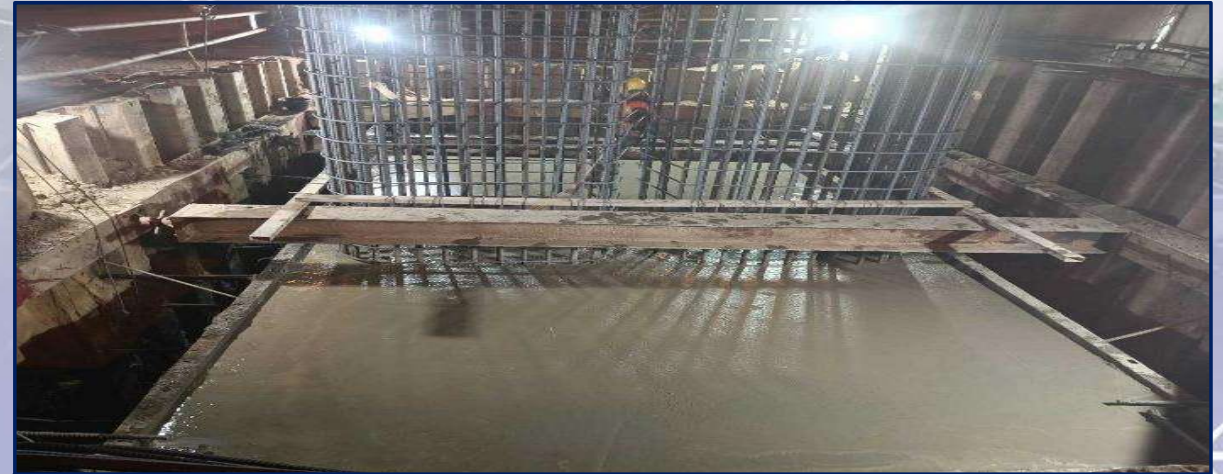


เทคอนกรีตฐานราก MLP09-13

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานก่อสร้างเสา (Column)




เทคอนกรีตเสาดอม่อ MLP07-15 Step-1

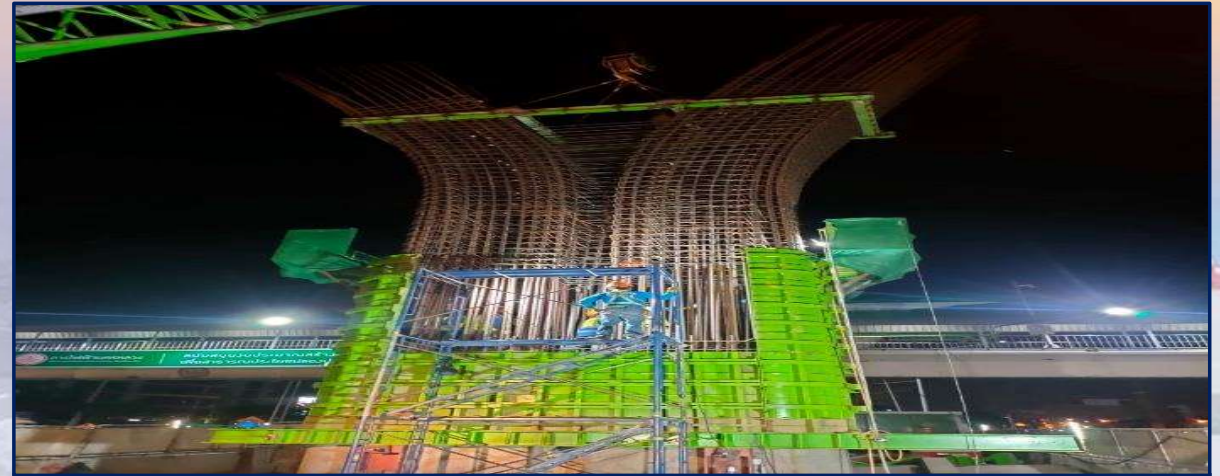

ติดตั้งเหล็กเสริมเสาดอม่อ MLP10-03 Step-2



เทคอนกรีตเสาดอม่อ MLP06-22 Step-2

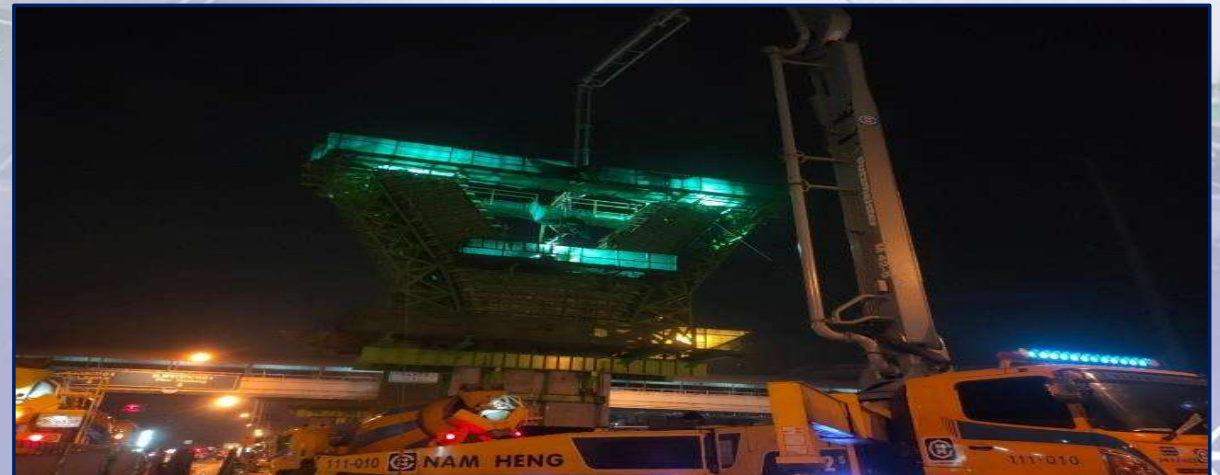

เทคอนกรีตเสาดอม่อ MLP08-14 Step-3

ภาพถ่ายงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง (Pre-cast Crosshead Installation)



ติดตั้ง Support คานคอนกรีตอัดแรง MLP06-17



ติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง MLP06-17 (Pre-cast Crosshead)



ดึงลวดขึ้นส่วนเปลือกคานคอนกรีตอัดแรง MLP06-21



เทคอนกรีตคานคอนกรีตอัดแรง MLP10-05

ภาพถ่ายงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Pre-cast Segment Erection)



เทคอนกรีต Bearing Plinth ที่ MLP10-13



เทคอนกรีต Bearing Plinth ที่ MLP10-07




ติดตั้ง Launching Gantry LG8 ที่ MLP10-07 to MLP10-08



ติดตั้ง Launching Gantry LG8 ที่ MLP10-07 to MLP10-08

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานหล่อชิ้นส่วนคานคอนกรีตอัดแรง (Pre-cast Crosshead Production)

TP YARD, HICRETE YARD, APC YARD

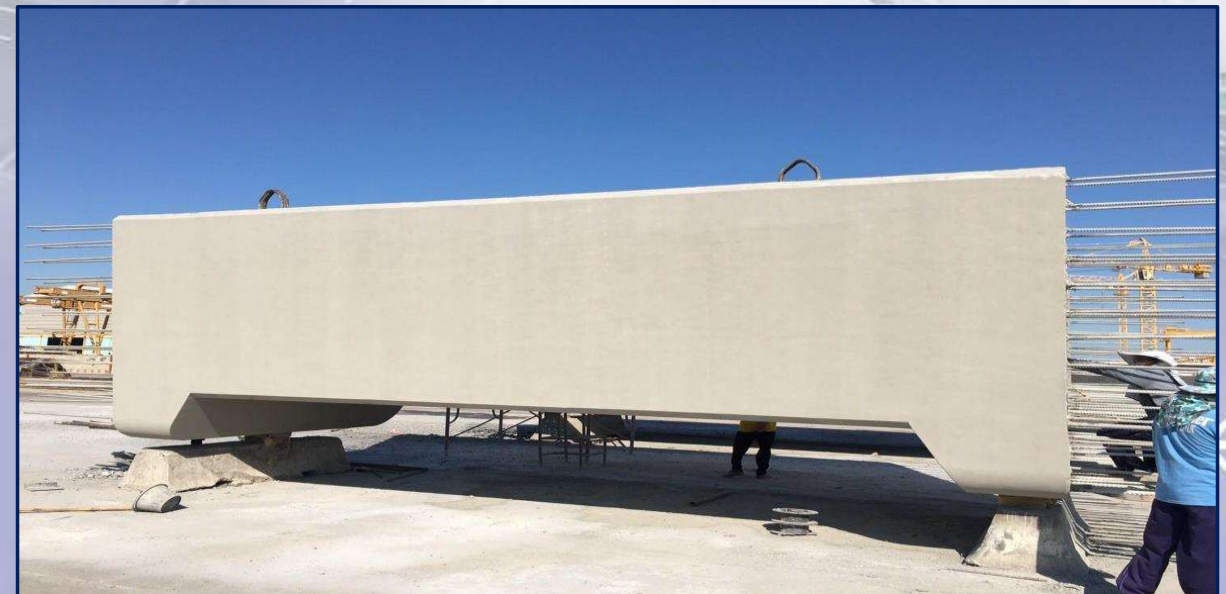

ภาพถ่ายความก้าวหน้างานหล่อชิ้นส่วนคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Pre-cast Segment Production)


ITD YARD, TBTC YARD, HICRETE YARD, GEL YARD



ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

งานควบคุมคุณภาพและงานทดสอบในโครงการฯ

การทดสอบ Sand Density Test : Lab CTB JV

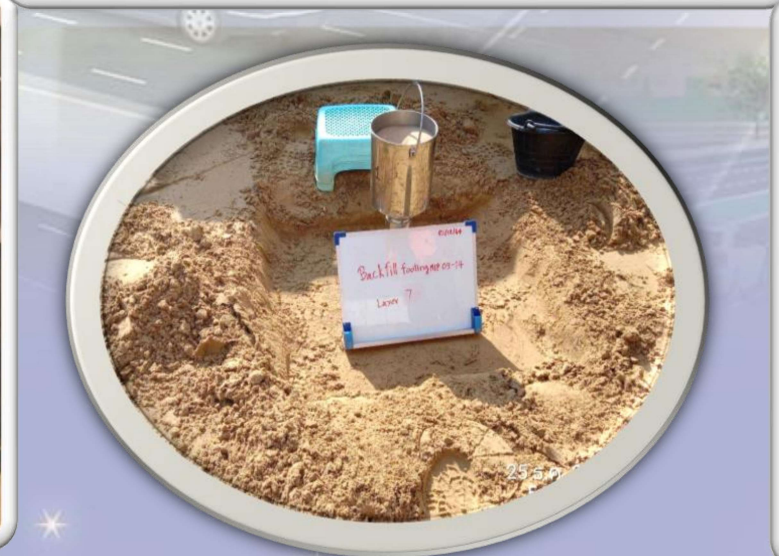

งานทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ 28 วัน : Lab CTB JV



ผลิต Precast Cross Beam (Tipakorn Factory) : อ.วังน้อย จ.อยุธยา



การผลิต Precast Cross Beam (Hicrete Factory) : อ.อุทัย จ.อยุธยา



การผลิต Precast Cross Beam (Advance Prefab Factory) : อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

