



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓๓ ของการดำเนินโครงการฯ)

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานสนามส่วนกลางของโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี)

ความก้าวหน้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ผลการดำเนินงาน

เริ่มต้นสัญญา

: 6 พฤษภาคม 2563

สิ้นสุดสัญญา

: 19 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาตามสัญญา

: 1,170 วัน


ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว

: 1,029 วัน (ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

ความก้าวหน้าของงาน

- งานเสาเข็มเจาะ Ramp
- งานก่อสร้างฐานราก Main Line & Ramp
- งานก่อสร้างเสา Main Line & Ramp
- งานก่อสร้างคานขวาง (Cross Beam, Portal Beam)
- งานติดตั้งชิ้นงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Parapet)
- งานผลิตชิ้นงาน (Precast Segmental Box Girder, Precast I-Girder, Precast Portal Beam, Precast Parapet)
- งานเทคอนกรีต Deck & Link Slab
- งานก่อสร้างรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคใต้ดินในพื้นที่โครงการฯ

สรุปความก้าวหน้างานที่ดำเนินการในโครงการฯ

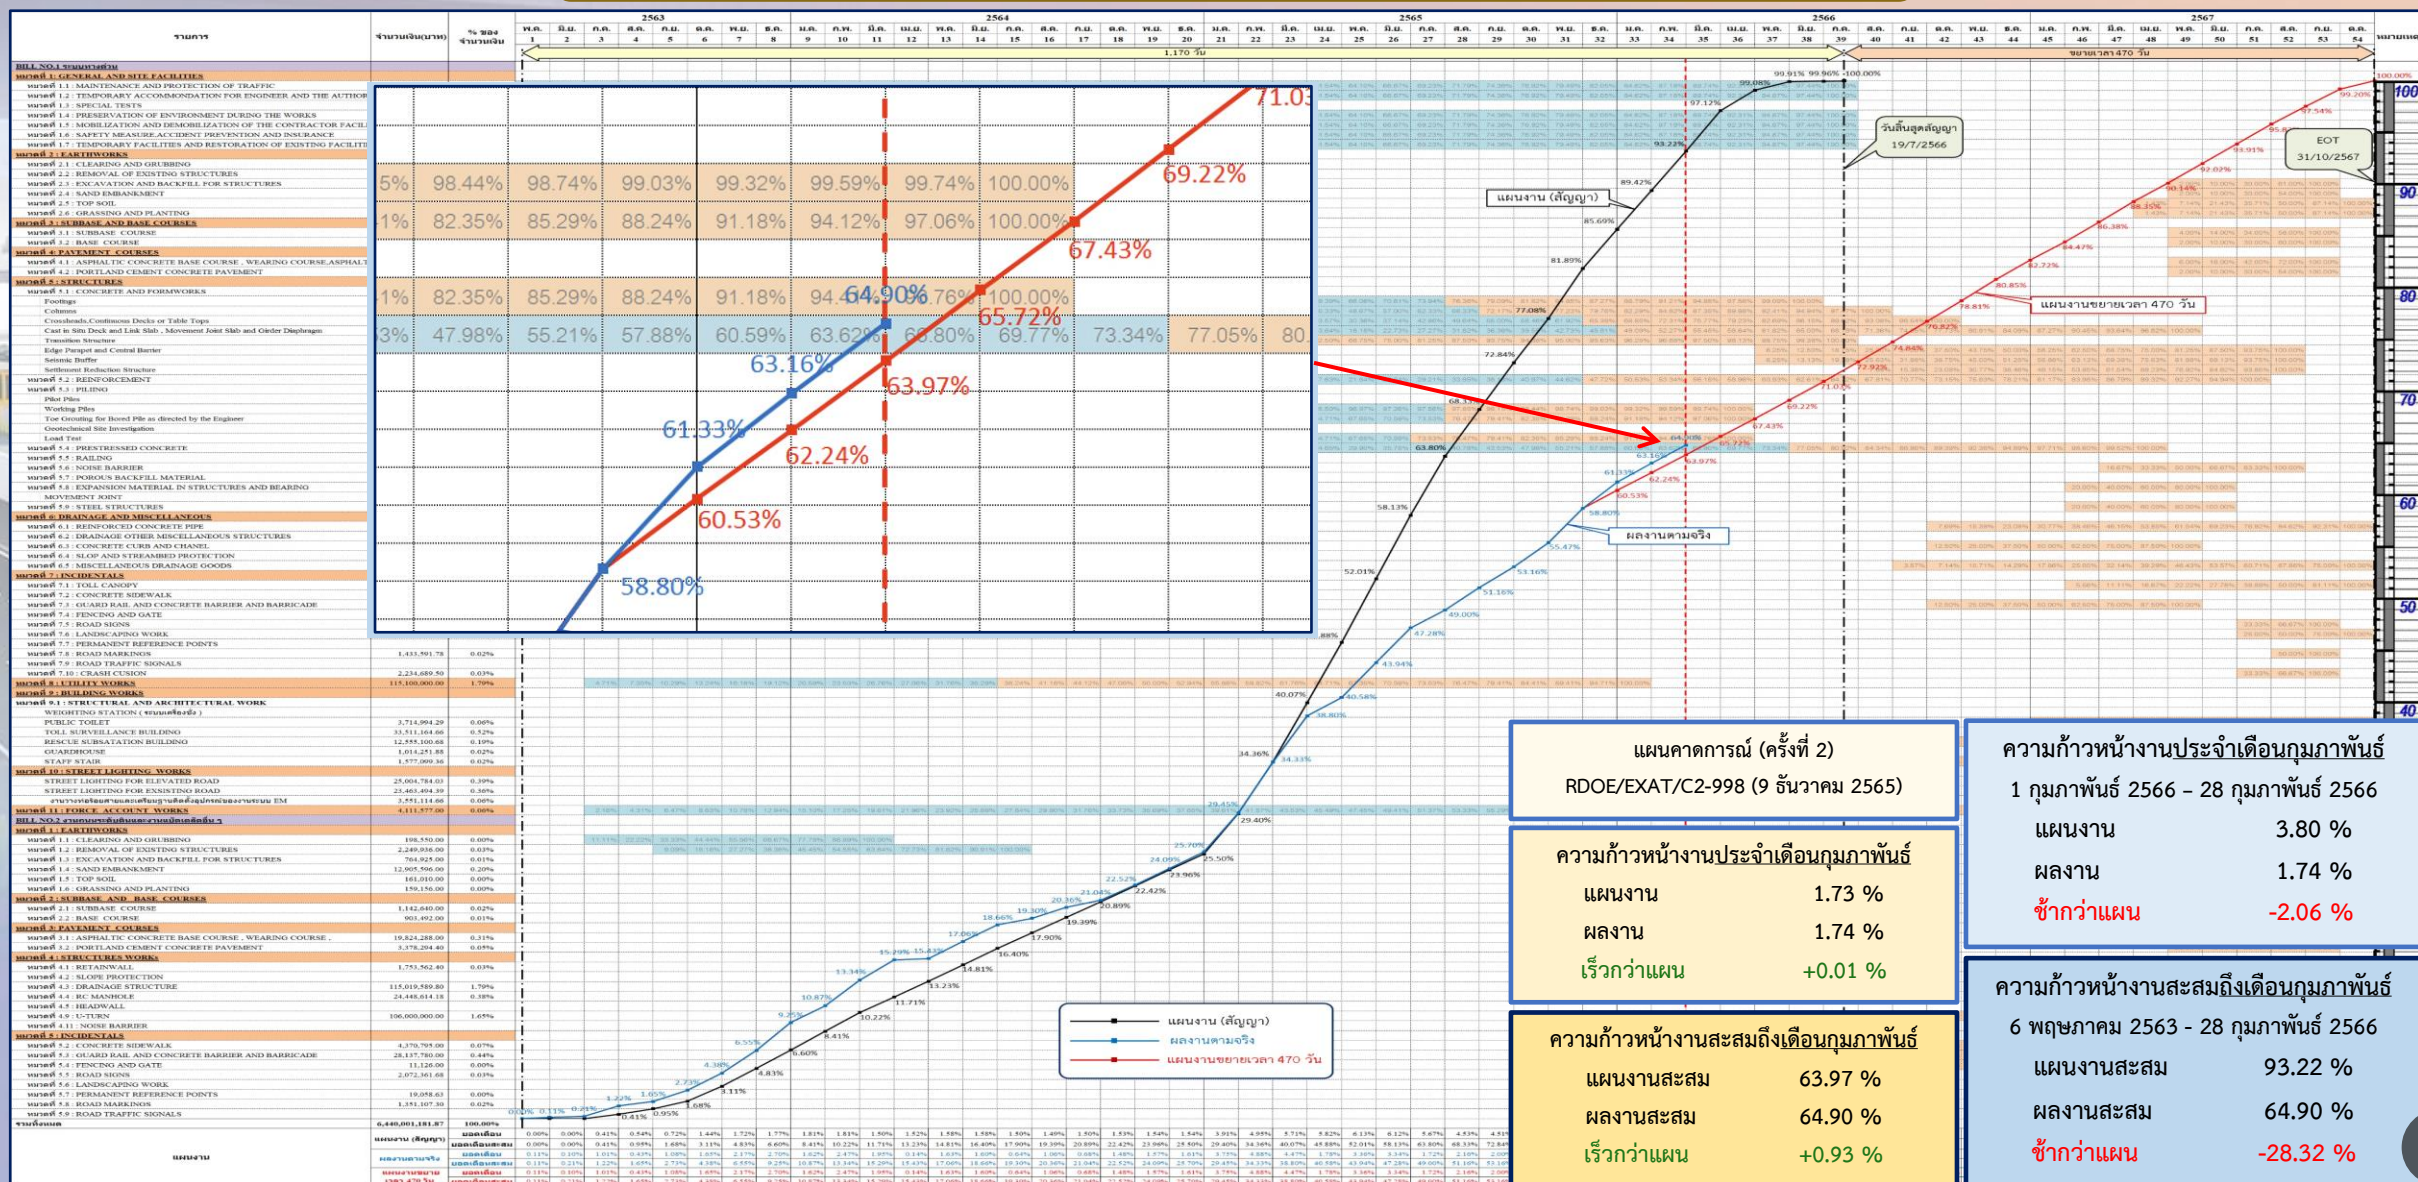

ความก้าวหน้างานสะสมถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

แผนงานตามสัญญา

แผนงานสะสม	93.22 %
ผลงานสะสม	64.90 %
ช้ากว่าแผน	-28.32 %

แผนงานคาดการณ์ (ครั้งที่ 2)

ตามหนังสือ RDOE/EXAT/C2-998

แผนงานสะสม	63.97 %
ผลงานสะสม	64.90 %
เร็วกว่าแผน	+0.93 %


ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

สรุปกำลังคน (Manpower) เดือนกุมภาพันธ์ 2566


พื้นที่ก่อสร้าง	On Site Workers
Zone 1	197
Zone 2	178
Zone 3	222
รวมทั้งหมด	597




งานสำรวจและรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบประปา

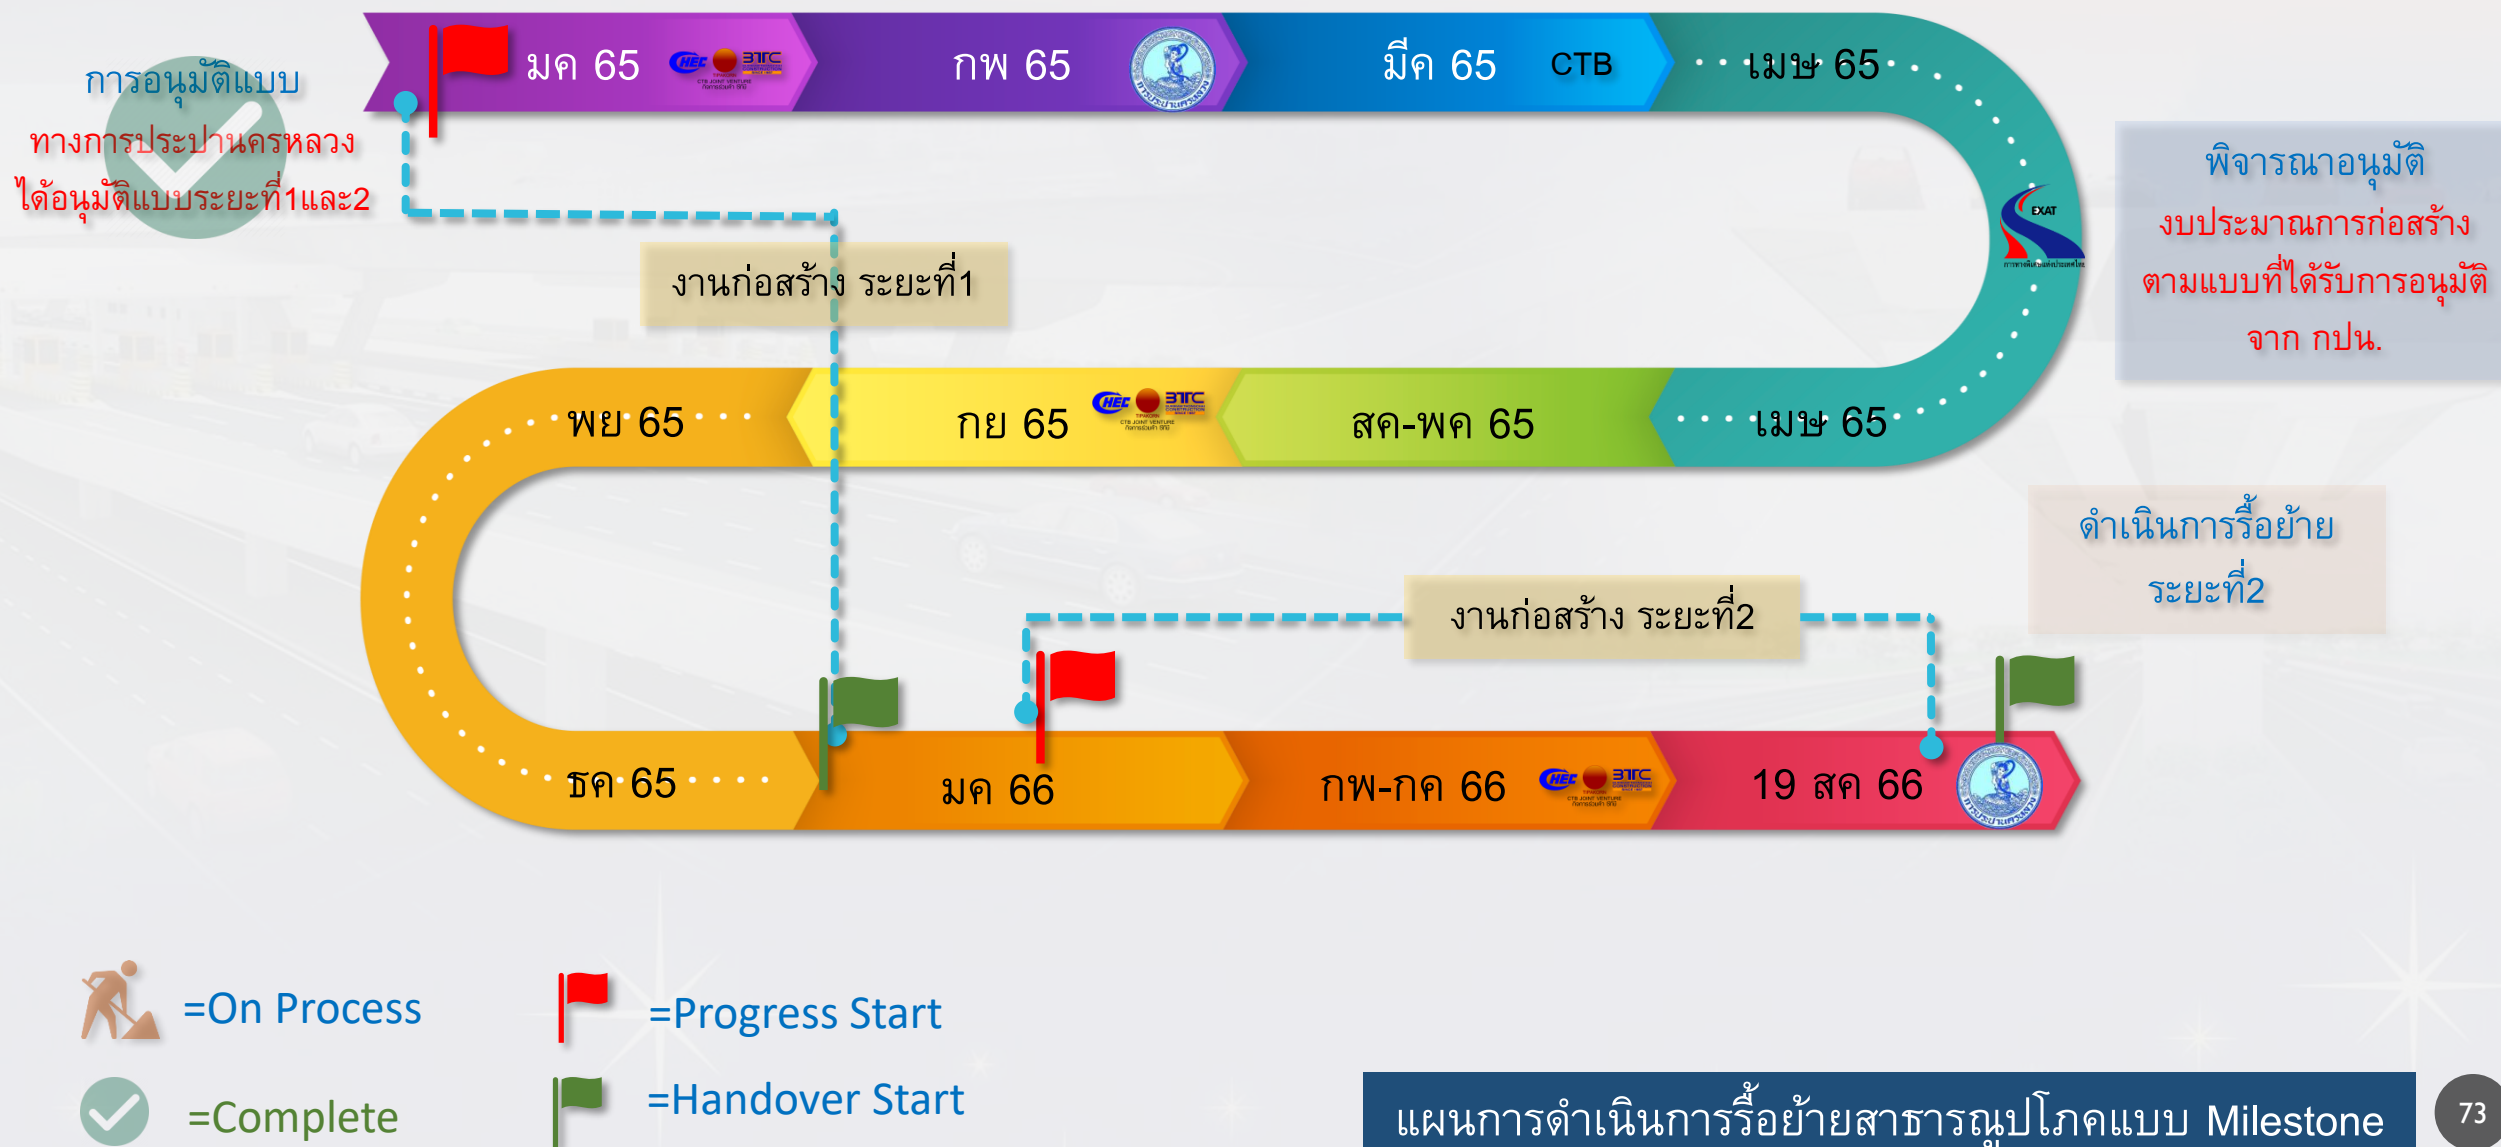

แผนงานรื้อย้ายท่อเมนประธาน การประปานครหลวง

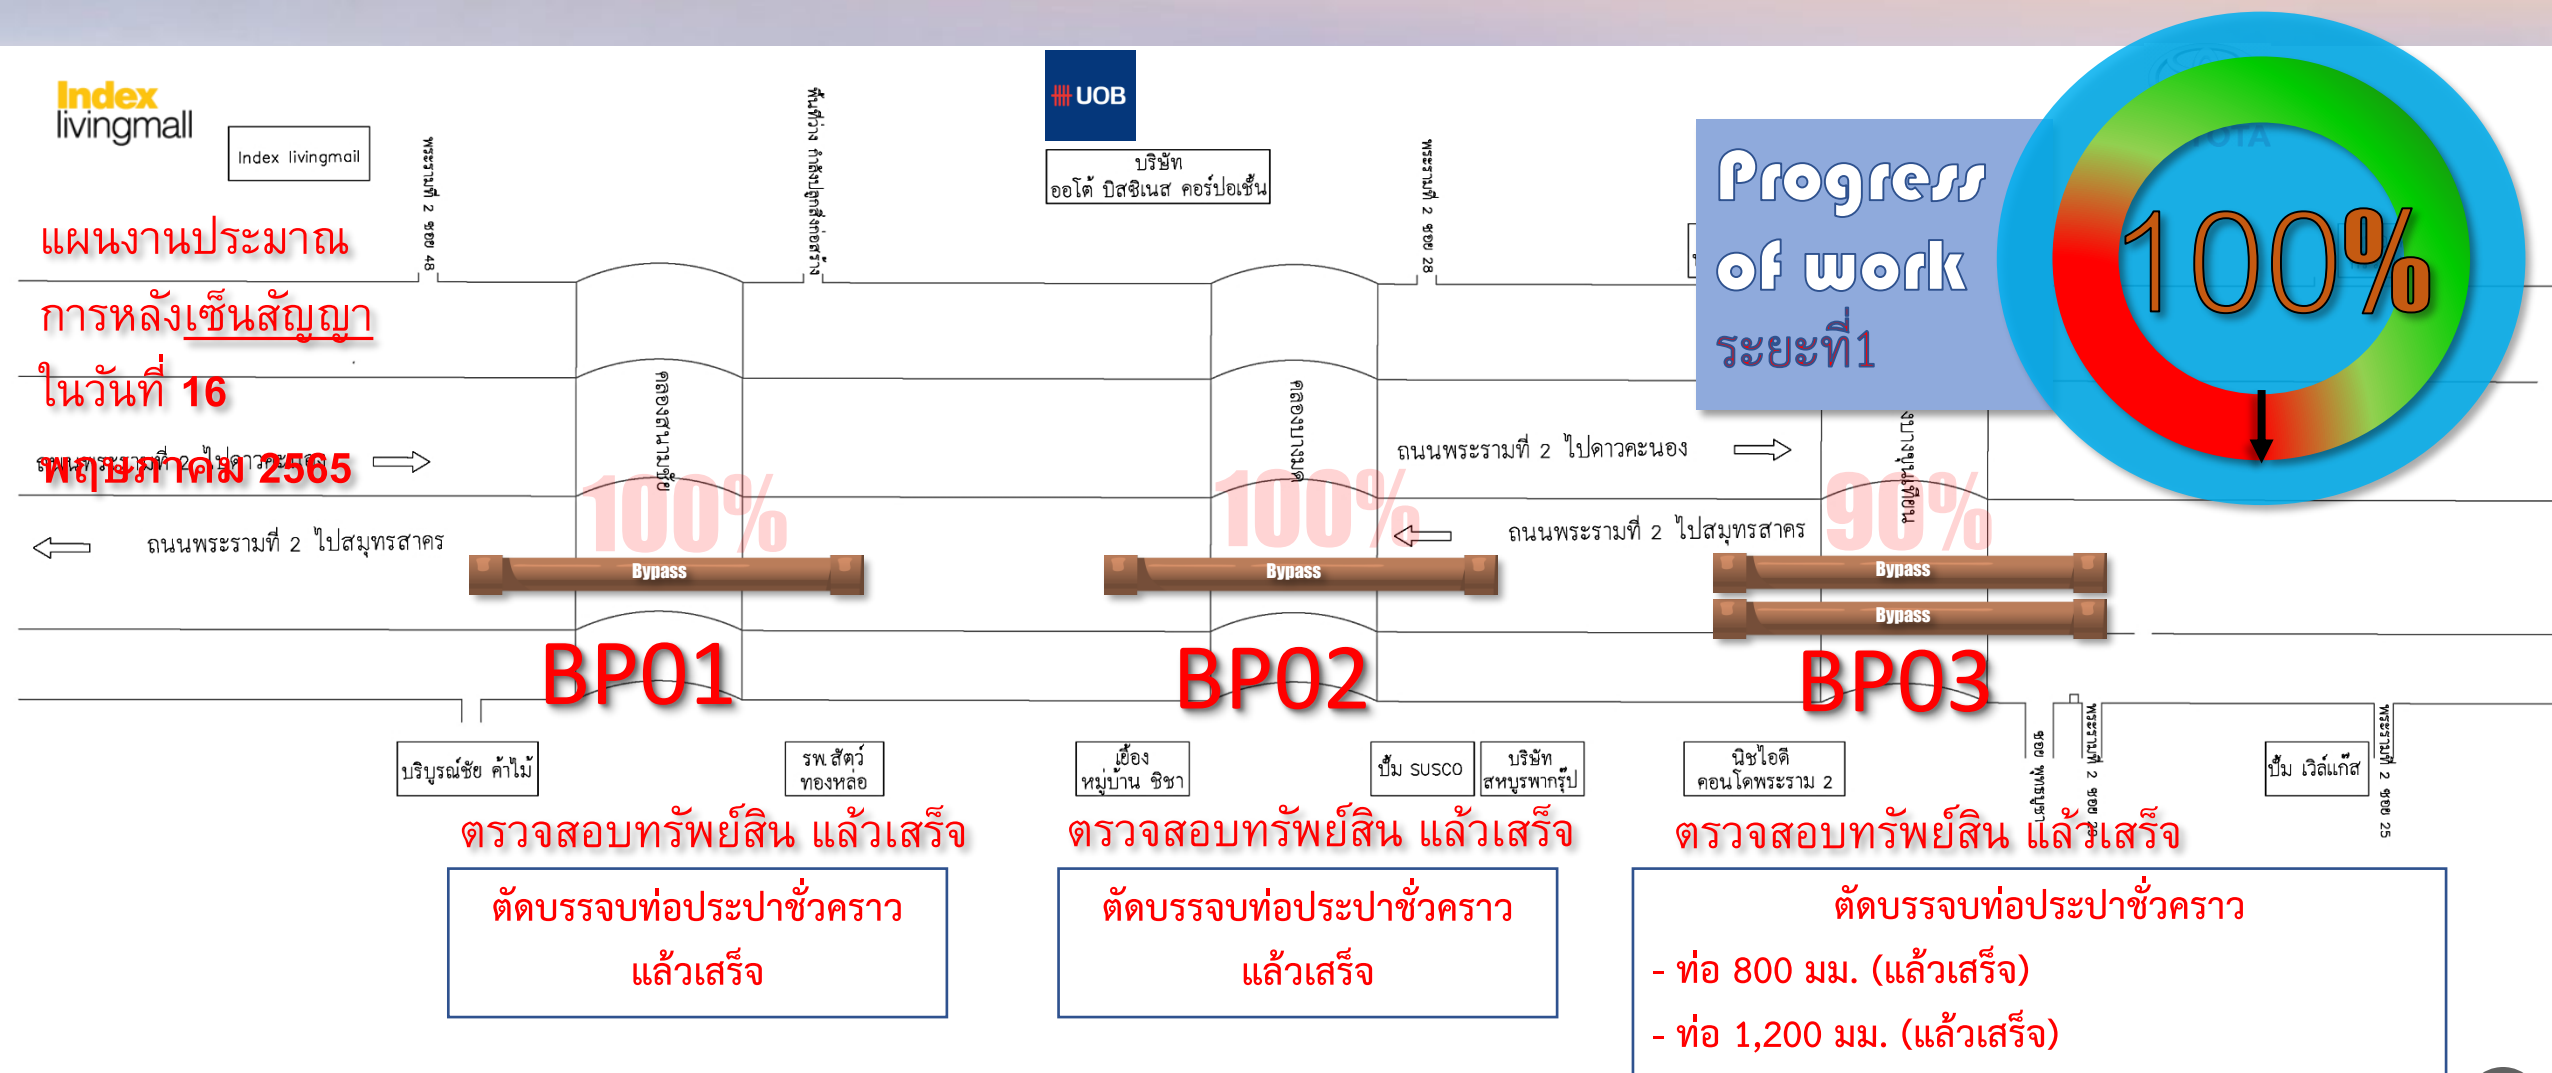


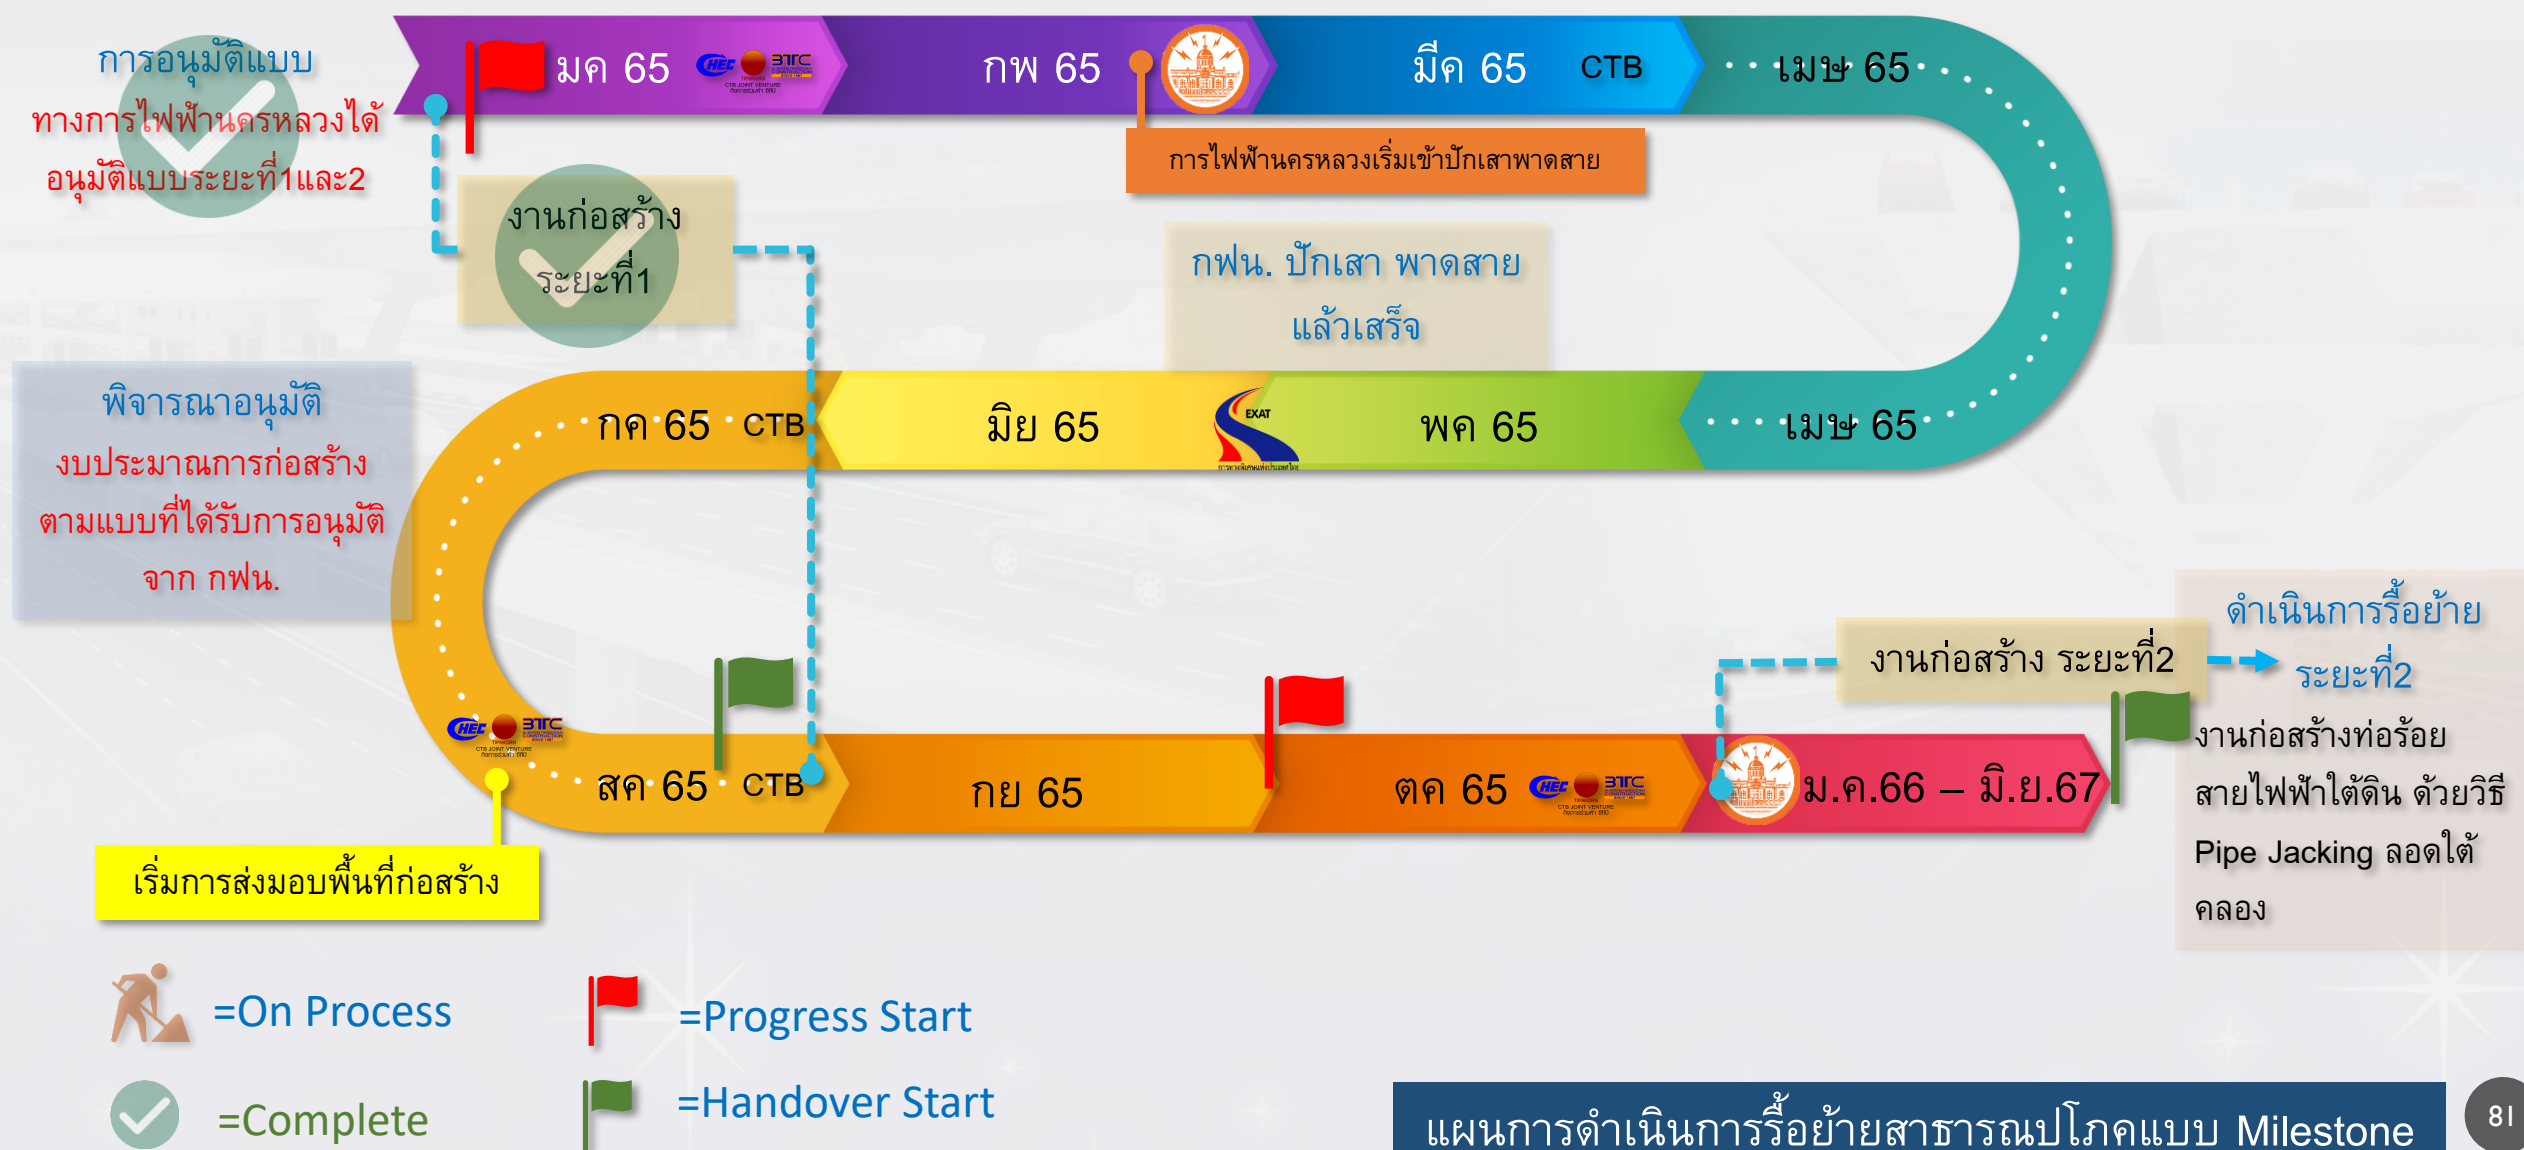

งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้า


งานรื้อย้าย ระยะที่1

Progress
of work

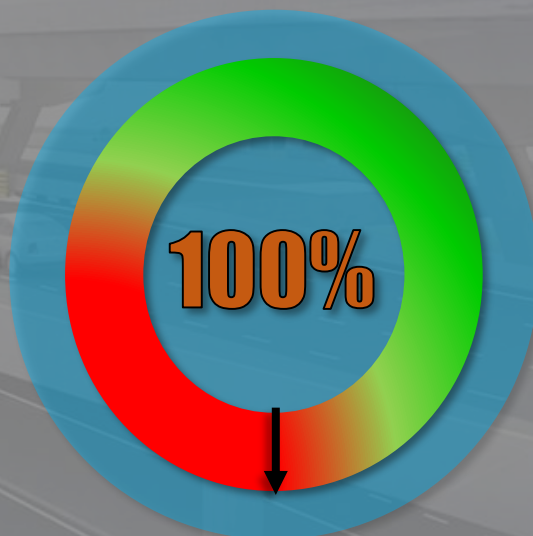


งานรื้อ-ย้าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีทีบี
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

งานรื้อย้าย ระยะที่2

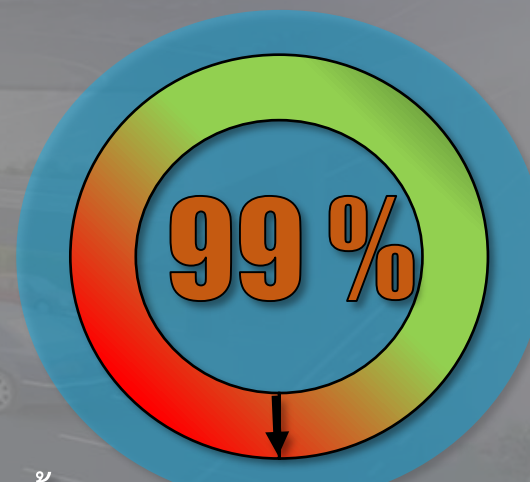

งานรื้อ-ย้าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีทีบี
งานออกแบบ (Redesign) HDD
ลอดใต้คลอง รอกการอนุมัติแบบจาก
การไฟฟ้านครหลวง

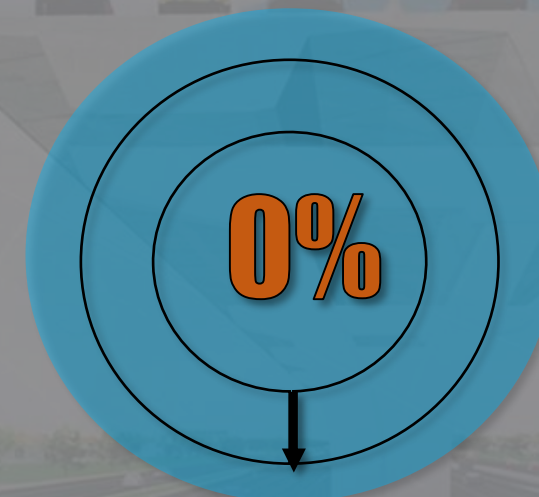

งานรื้อ-ย้าย ระบบไฟฟ้าใต้ดิน
ดำเนินการโดย กิจการร่วมค้า ซีทีบี
งานก่อสร้าง HDD ลอดใต้คลอง

งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค

nt บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
National Telecom Public Company Limited



ดำเนินการเอกสารงานสื่อสารใต้ดินตามขั้นตอน เซ็นต์ ครบแล้ว 25/08/65
ดำเนินการเอกสารตามขั้นตอน เซ็นต์ ครบแล้ว

ดำเนินการเอกสารงานสายสื่อสารใต้ดินตามขั้นตอนเสร็จแล้ว
Zone 1 NT และ Zone 2 และ NT Zone 3 NT จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบจาก NT ผู้ควบคุมงาน
ได้รับแบบจาก NT3.2 แล้ว



=On Process



=Complete
