



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ผลการดำเนินงาน

- ระยะเวลาตามสัญญา : 1,170 วัน
- ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว : 87 วัน (ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
- ความก้าวหน้าของงาน
- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
 - งานรื้อย้ายทรัพย์สินของ ทล. และ กทม.
 - งานเสาเข็มทดสอบ
 - งานเสาเข็มเจาะ
 - งานสำรวจระบบสาธารณูปโภค
 - งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
 - งานติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งาน Pile Cap สำหรับ Pilot Barrette Pile 1.00x3.00 m. & 1.00x3.80 m. และงานติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ Static Load Test

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานรื้อย้ายต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร




รายการ	ปริมาณตามแบบ		ผลงานสะสมถึงเดือนนี้ (31 ก.ค. 63)		ผลงานสะสมถึงปัจจุบัน (21 ส.ค. 63)		แผนงานสะสมถึงเดือนถัดไป (31 ส.ค. 63)	
	ปริมาณ	คิดเป็น	ปริมาณ	คิดเป็น	ปริมาณ	คิดเป็น	ปริมาณ	คิดเป็น
Zone 1	487	100%	487	100%	487	100%	-	-
Zone 2	1,011	100%	313	31.00%	644	63.70%	1,011	100%
Zone 3	509	100%	509	100%	509	100%	-	-

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานติดตั้ง Guide Wall for Barrette Pile 1.00x3.80 m.

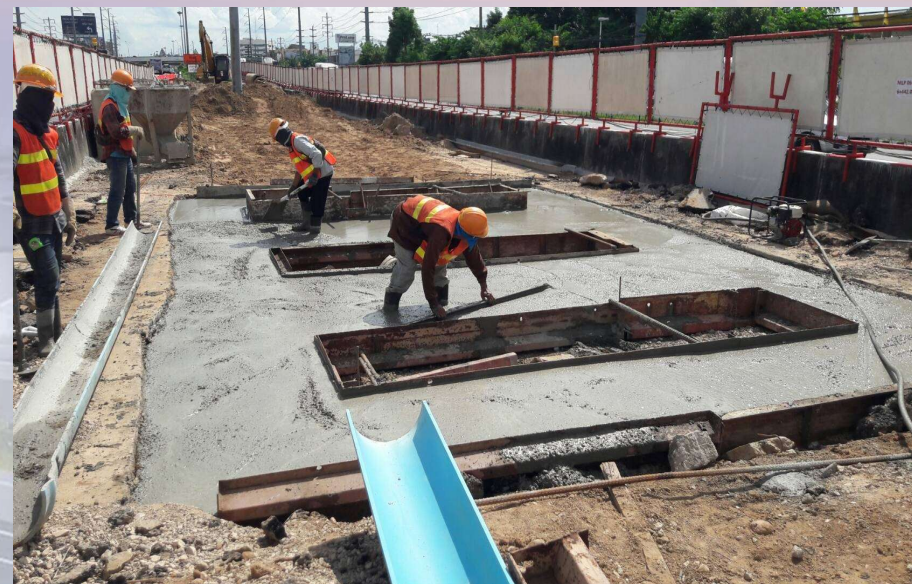

รายการ	ปริมาณตามแบบ		ผลงานสะสมถึงเดือนนี้ (31 ก.ค. 63)		ผลงานสะสมถึงปัจจุบัน (21 ส.ค. 63)		แผนงานสะสมถึงเดือนถัดไป (31 ส.ค. 63)	
	ปริมาณ	คิดเป็น	ปริมาณ	คิดเป็น	ปริมาณ	คิดเป็น	ปริมาณ	คิดเป็น
Zone 1	161	100%	6	3.73%	27	16.77%	36	22.36%
Zone 2	158	100%	-	0.00%	6	3.80%	12	7.60%
Zone 3	156	100%	-	0.00%	6	3.85%	9	5.77%

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง



ZONE 1 : STA.6+369.090 – STA.8+271.161

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง



ZONE 2 : STA.8+271.161 – STA.10+127.747

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง



ZONE 3 : STA.10+127.747 – STA.11+690.577

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒






การสำรวจระบบสาธารณูปโภค



เจาะสำรวจสาธารณูปโภคบริเวณ กม.9+564 – กม.9+672

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การสำรวจระบบสาธารณูปโภค

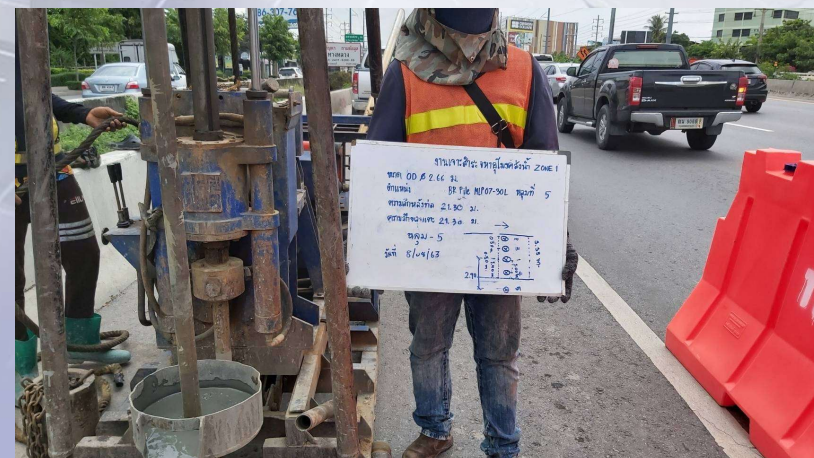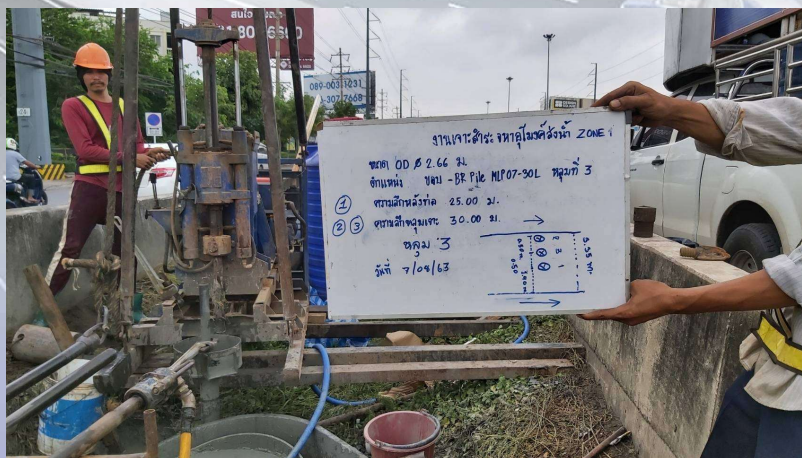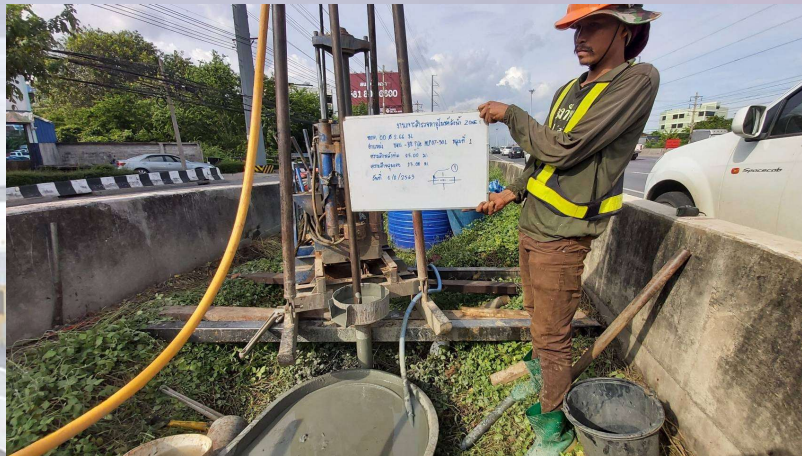

เจาะสำรวจอุโมงค์ส่งน้ำตำแหน่ง Barrette Pile MLP07-30L

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานติดตั้งกล้อง CCTV และป้าย VMS


โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV สัญญาที่ 2




โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานติดตั้งกล้อง CCTV สัญญาที่ 2

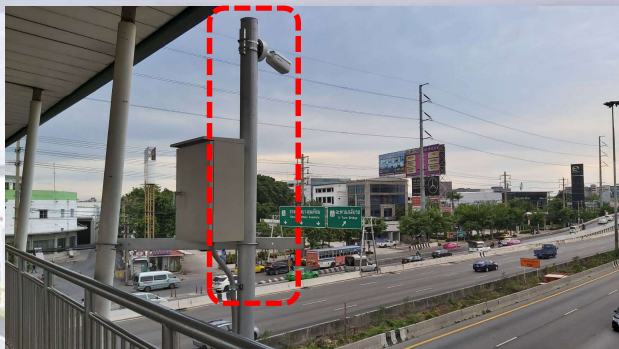

จุดที่ 1 STA.7+155

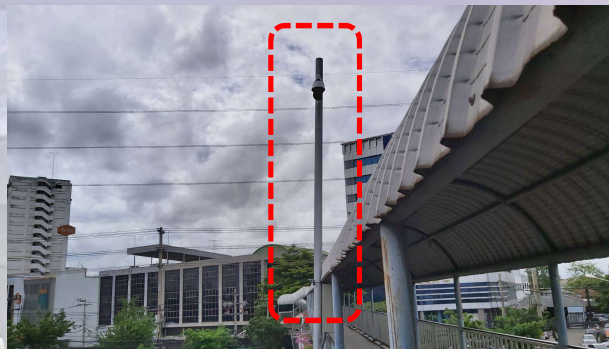

จุดที่ 2 STA.7+214



จุดที่ 3 STA.9+262



จุดที่ 4 STA.10+063



จุดที่ 5 STA.11+155

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



แผนงานติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS)

รายการ	วันที่		ระยะเวลา (วัน)	สิงหาคม 2563				กันยายน 2563	
	เริ่ม	เสร็จ		W1	W2	W3	W4	W1	W2
งานติดตั้งป้าย VMS									
- งานเชื่อมประกอบโครงเหล็กป้าย VMS	18/7/2563	8/6/2563	20						
- งานซุกกลวไนซ์โครงเหล็กป้าย VMS	8/7/2563	16/8/2563	10						
- งานประกอบ & ติดตั้งโครงเหล็กป้าย VMS	17/8/2563	28/8/2563	11						
- งานติดตั้งป้าย VMS & ทดสอบระบบ	29/8/2563	9/5/2563	9						



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒




งานด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน คลองสนามชัย (ด้านเหนือน้ำ)

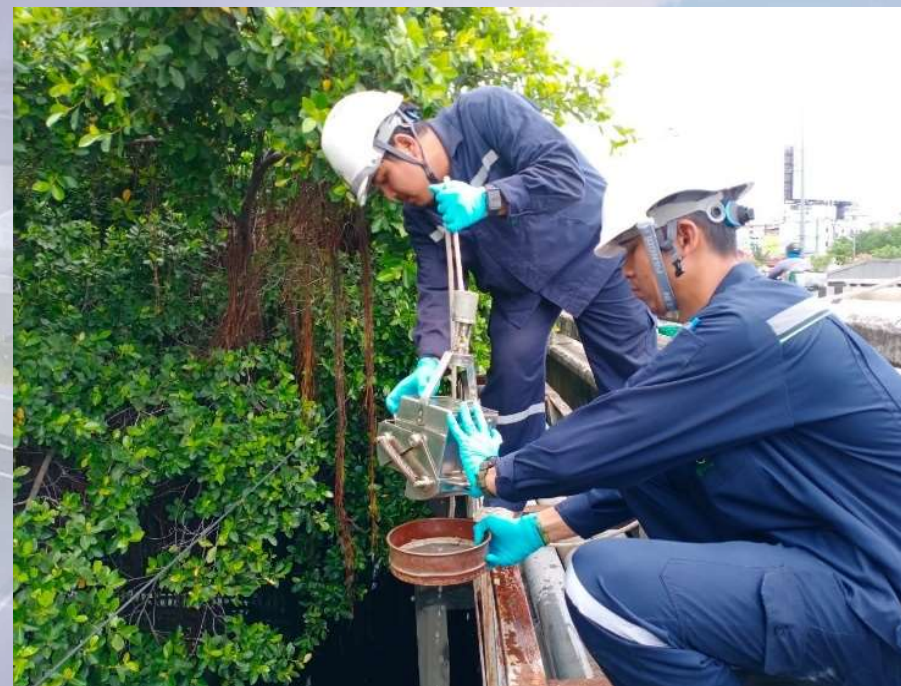

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน คลองสนามชัย (ด้านท้ายน้ำ)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



การตรวจวัดคุณภาพน้ำ คลองบางขุนเทียน (ด้านเหนือ)



การตรวจวัดคุณภาพน้ำ คลองบางขุนเทียน (ด้านท้ายน้ำ)

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริเวณโรงพยาบาลนครธน



บริเวณโรงเรียนสมบุญวิทย์

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ และระดับความดังของเสียง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริเวณโรงพยาบาลบางปะกอก 9



บริเวณโรงพยาบาลบางมด

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ และระดับความดังของเสียง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 42



บริเวณวัดยายร่ม

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ และระดับความดังของเสียง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริเวณวัดเลา

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ และระดับความดังของเสียง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



การประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวเนล) เรื่องการเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2
บริเวณหน้าสำนักเขตบางขุนเทียน

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



การประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไว้นิล) เรื่องการเบี่ยงจราจรบนถนนพระราม 2
บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการรถยนต์ ISUZU



จบการนำเสนอ

