



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความก้าวหน้าประจำเดือนของการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลงานเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานทดสอบเสาเข็ม Barrette Pile 1.00x3.00 m.



งานทดสอบเสาเข็ม Barrette Pile 1.00x3.00 m.



งานทดสอบเสาเข็ม Barrette Pile 1.00x3.80 m.



งานทดสอบเสาเข็ม Barrette Pile 1.00x3.80 m.

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานติดตั้งผนังนำร่องเสาเข็มเจาะ MLP06-19



งานติดตั้งแบบหล่อผนังนำร่องเสาเข็มเจาะ MLP10-18



งานเทคอนกรีตผนังนำร่องเสาเข็มเจาะ MLP08-11



งานเทคอนกรีตยึดผนังนำร่องเสาเข็มเจาะ MLP10-18


โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒




งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile 1.00x3.80 m. MLP06-15 No.2



งานเจาะเสาเข็ม Barrette Pile 1.00x3.80 m. MLP08-11C No.2

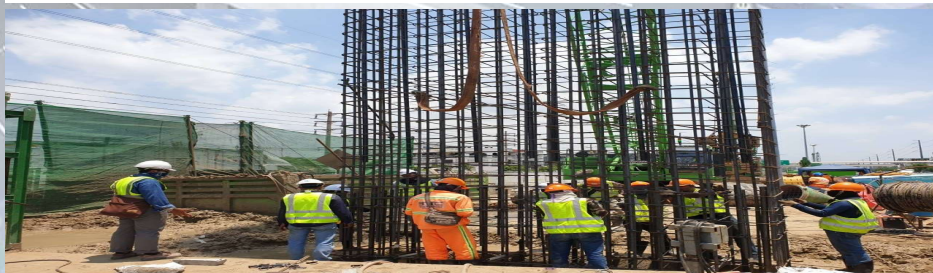

งานลงเหล็ก Barrette Pile 1.00x3.80 m. MLP08-09C No.1

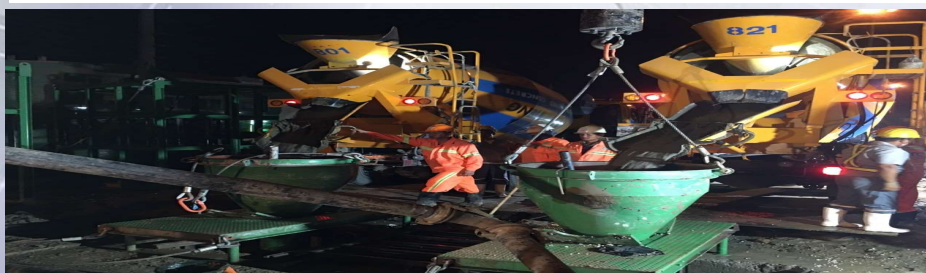

งานเทคอนกรีต Barrette Pile 1.00x3.80 m. MLP08-11C No.2

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ผลิต Segment ที่โรงหล่อ TBTC PRECAST YARD SEGMENT บ่อวิน : Zone 2 (BTC)



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานติดตั้งกล้อง CCTV และป้าย VMS


โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)




โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

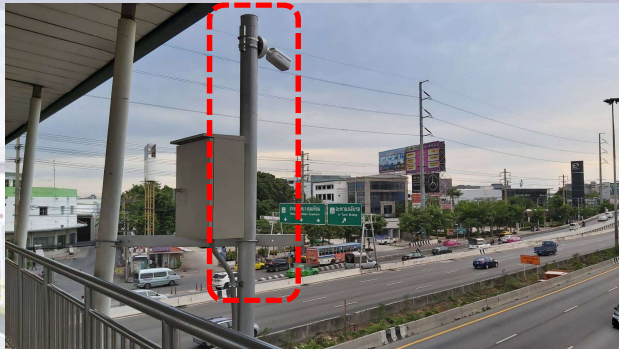

จุดที่ 1 STA.7+155

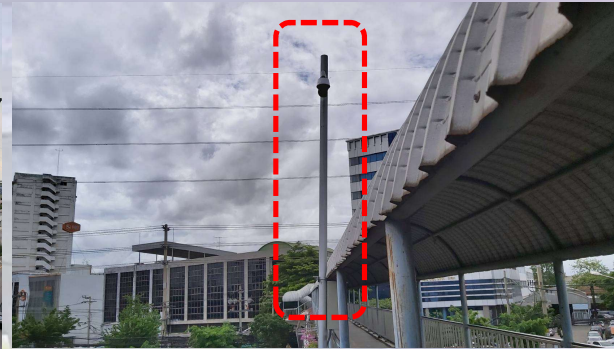

จุดที่ 2 STA.7+214



จุดที่ 3 STA.9+262



จุดที่ 4 STA.10+063



จุดที่ 5 STA.11+155

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



แผนงานติดตั้งป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS)

รายการ	วันที่		ระยะเวลา (วัน)	สิงหาคม 2563				กันยายน 2563	
	เริ่ม	เสร็จ		W1	W2	W3	W4	W1	W2
งานติดตั้งป้าย VMS									
- งานเชื่อมประกอบโครงเหล็กป้าย VMS	18/7/2563	6/8/2563	20						
- งานซุกกลวไนซ์โครงเหล็กป้าย VMS	7/8/2563	16/8/2563	10						
- งานประกอบ & ติดตั้งโครงเหล็กป้าย VMS	17/8/2563	26/8/2563	10						
- งานติดตั้งป้าย VMS & ทดสอบระบบ	9/9/2563	15/9/2563	7						



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานสำรวจสาธารณูปโภค

งานเจาะสำรวจตำแหน่งท่อประปาขนาด Dia.2,000 มม. (ST) MLP07-30L ความลึกหลัง
ท่อ 21.30 เมตร(ผิวจราจร) ZONE 1



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานสำรวจสาธารณูปโภค

งานเจาะสำรวจตำแหน่งท่อประปาขนาด Dia.2,000 มม. (ST) กม.10+432 MLP10-15
ความลึกหลังท่อ 21.35 เมตร (ผิวจราจร) ZONE 3



MIP10-15

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานสำรวจสาธารณูปโภค

งานเจาะสำรวจตำแหน่งท่อประปาขนาด Dia.2,500 มม. (ST) Main line MLP10-15
กม.10+432 ความลึกหลังท่อ 22.35 เมตร (ผิวจราจร)




MIP10-15

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานสำรวจสาธารณูปโภค

งานเจาะสำรวจตำแหน่งท่อประปาขนาด Dia.1,000 มม.(ST) กม.8+100 - 8+300 ความลึกหลังท่อ 4.00 เมตร ช่วงสะพานคลองสนามชัย (ฟิวเจอร์)

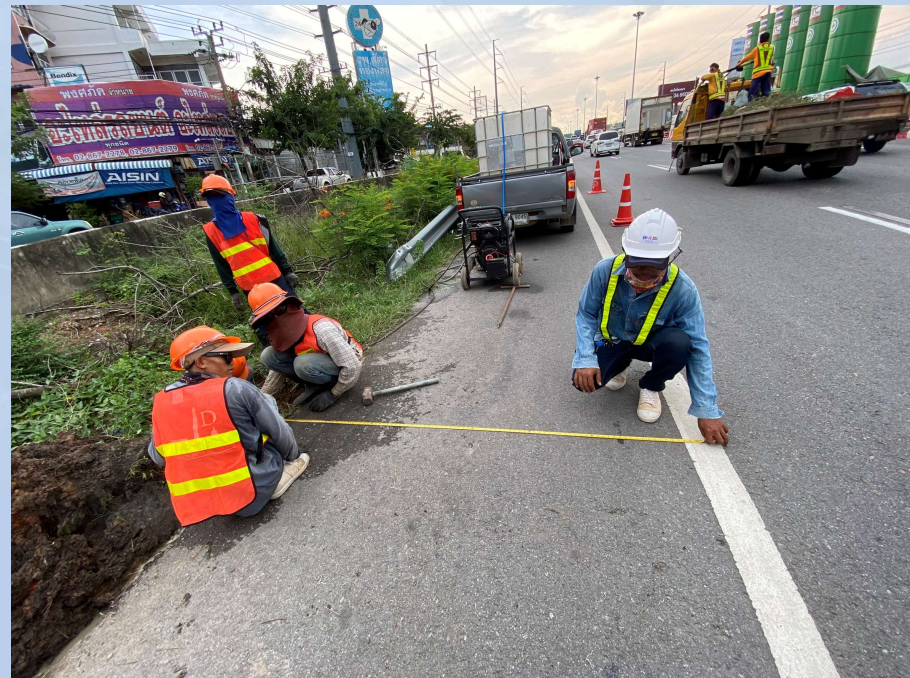

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



งานสำรวจสาธารณูปโภค

งานเดินสำรวจรายละเอียดและตำแหน่งสังเขปท่อประปากับเจ้าหน้าที่ประปานครหลวง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานสำรวจสาธารณูปโภค

งานสำรวจเก็บค่าพิกัดตำแหน่ง บ่อวาล์ว และท่อข้ามคลอง



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

งานสำรวจสาธารณูปโภค

การสำรวจท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน (Duct Bank)

Survey สำรวจเก็บค่าพิกัดตำแหน่ง Manhole




โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การปิดกั้นพื้นที่ทำงานภายในโครงการ

Zone 1

กม.6+600 ถึง กม.5+900


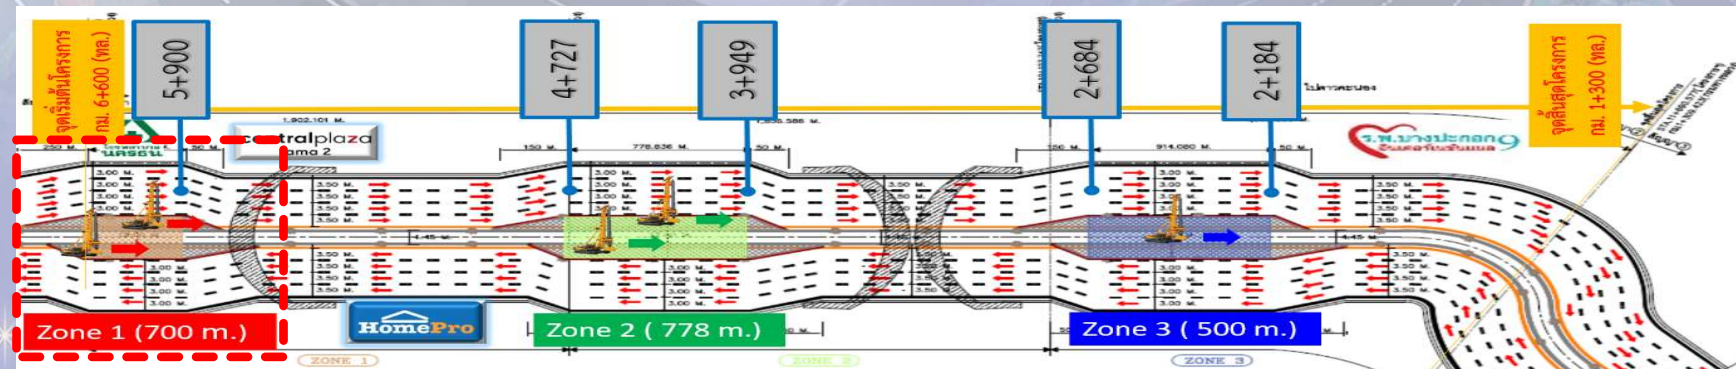


โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การปิดกั้นพื้นที่ทำงานภายในโครงการ

Zone 2

กม.4+727 ถึง กม.3+949

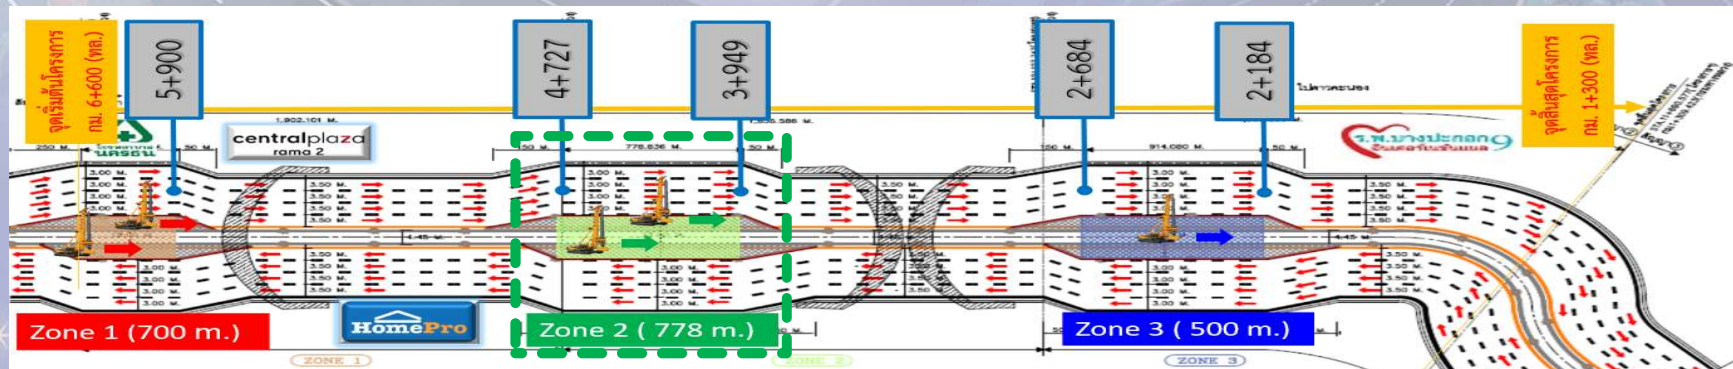



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การปิดกั้นพื้นที่ทำงานภายในโครงการ



Zone 3

กม.2+684 ถึง กม.2+184

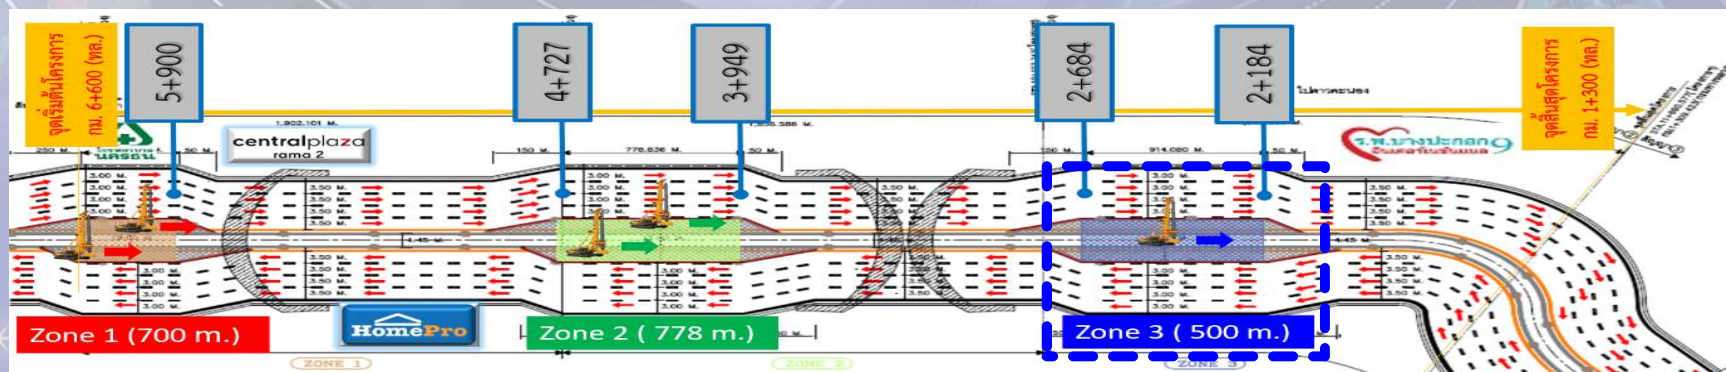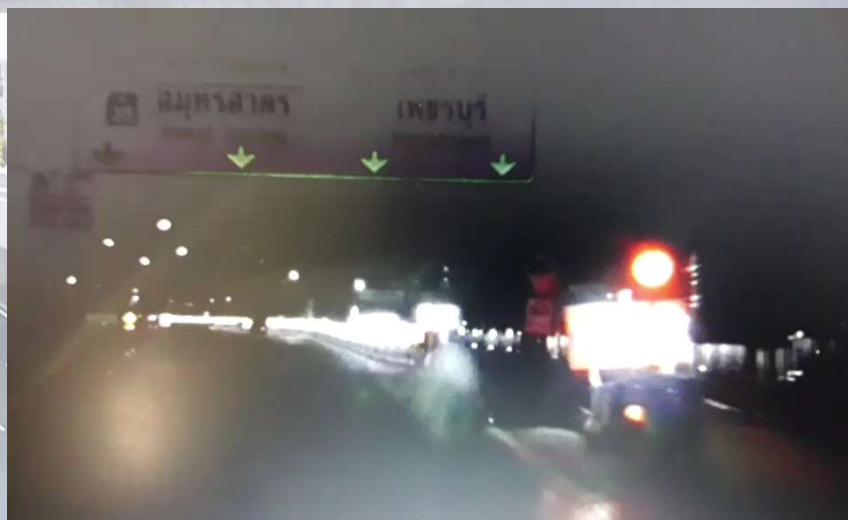

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

การปิดกั้นพื้นที่ทำงานภายในโครงการ

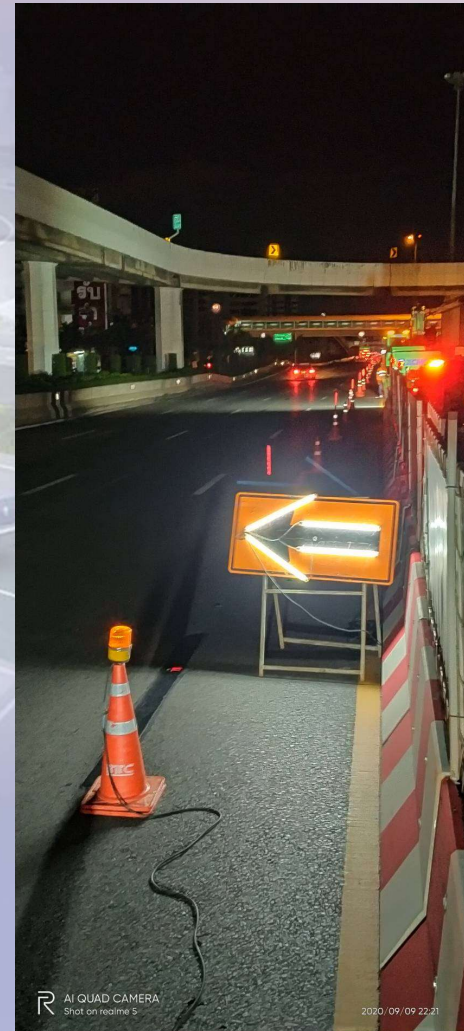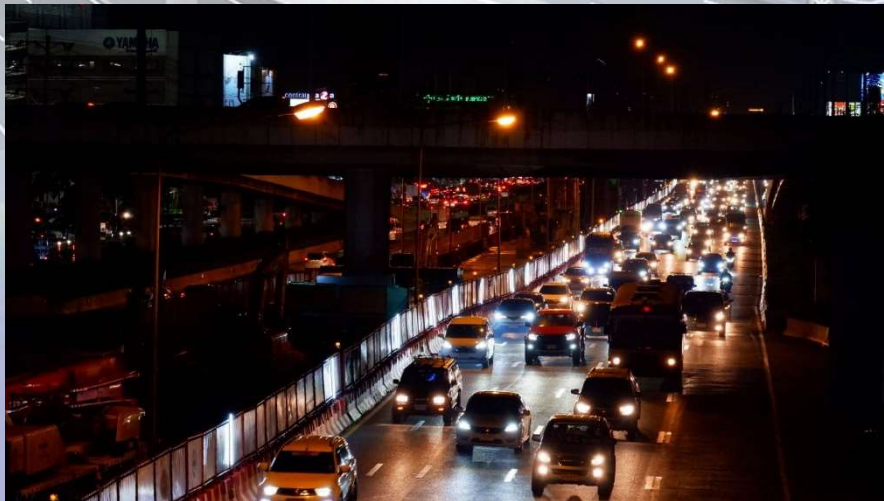

โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒



การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Audit)
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563





บริษัท เอชซีเอส จำกัด

AEC

Asian Engineering Consultants Corp., Ltd.



CHOTICHINDA

CHOTICHINDA CONSULTANTS LIMITED



CTB Joint Venture
กิจการร่วมค้า ซีทีบี

จบการนำเสนอ
